
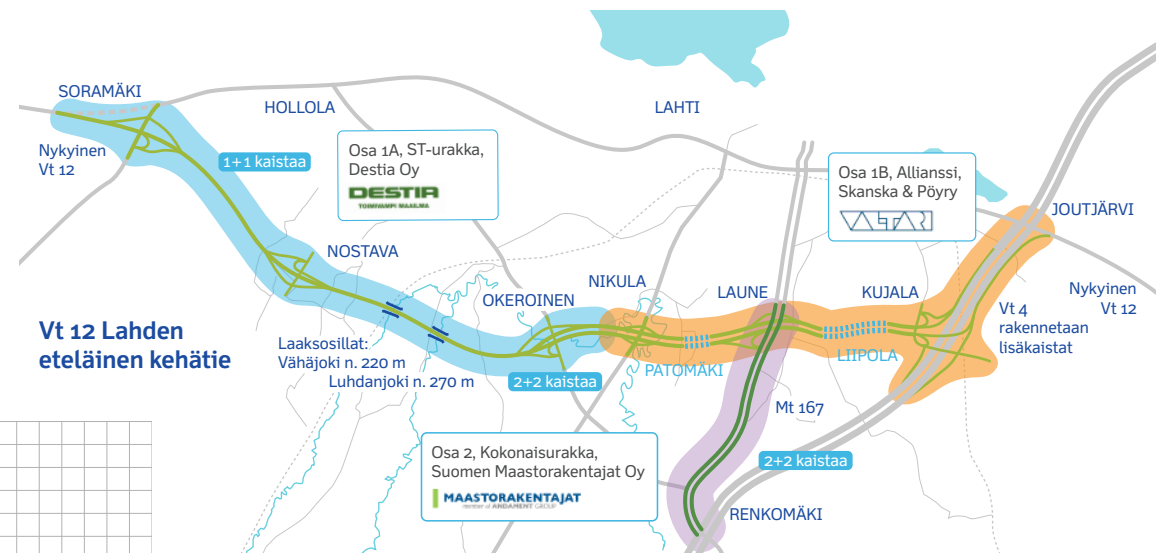


Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Hankekokonaisuus Top 3

1. Kehätien rakentaminen käynnistyi!
2. Hankkeen henkilövahvuus kasvussa
3. Uudenmaankadulla siltatyöt etenevät hienosti

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0,
rakentamisen alusta 337 tapaturmatonta päivää



Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Kevättä kohti edetään ja siltatyöt olivat pääosassa tälläkin viikolla. Hankaankadun risteyssillan valmistuminen hämmöttää jo Renkomäen maisemissa, ja kevään edetessä päästään rakentamaan katuyhteyttä sillan ali. Alkukesästä paikalla nyt oleva kiertotie puretaan ja sillan yli pääsee huristelemaan normaalia reittiä pitkin. Launeella etenee urakan suurimman sillan, Launeen risteyssillan, rakentaminen kannen raudoitustyöillä. Lisäksi alueella on käynnissä paalulaattojen sekä kahden alikulkukäytävän rakentaminen. Maatöitä päästään tekemään vähitellen, kun päivän keskilämpötilat kohoavat plussan puolelle.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Hankaankadun risteyssillan kaiteiden juurivalut ja valaisimien jalustan valu
- Vanhan Kangasmäen alikulkukäytävän purkutyöt
- Nikkilän alikulkukäytävän paalutuspedin rakentaminen
- Teline-, muotti- ja raudoitustyöt Launeen risteyssillan kannella sekä Patomäen ja Launeen alikulkukäytävien kehäsilloilla
- Kiertotien rakentamisen valmistelut Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla
- Paalulaattojen rakentaminen jatkuu Launeella
- Uudenmaankadulla rakennetaan hulevesilinjoja ja Renkomäessä tierakenteita
- Uudenmaankadun bussipysäköitä Patometsänkadulle johtava jalankulun ja pyöräilyn väylä siirretään kiertotielle. Muilta osin liikennejärjestelyt säilyvät toistaiseksi ennallaan

Viikon onnistumiset

- Launeen pellolla riitti tohinaa, kun kolme siltaa rakentui hyvää tahtia



Launeen risteyssillalla kannen muotti- ja raudoitustyöt ovat hyvässä vauhdissa.

Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Työt ovat edenneet vauhdikkaasti, ja esimerkiksi Soramäessä kalliota kuori viisi kaivinkonetta erityisesti tulevia louhintoja varten. Kuoritut kasat on mahdollisuuksien mukaan jätetty lähelle louhintapaikkaa melusuojiksi. Lisäksi alueella tehtiin kuivatuksia pian sulavia lumia ja sulamisvesiä silmällä pitäen. Soramäen tulevan eritasoliittymän itäpuolella suojattiin olemassa olevia rakenteita, ja porattiin kalliota ensi viikolla alkavaa louhintaa varten. Kuusenalantien ja Tikkakalliontien välinen kiertotie on pieniä viilauksia lukuun ottamatta valmis. Patiokalliosta puhdistettiin ja porattiin kalliota louhintaa varten sekä tehtiin kuivatuksia ja kulkuteitä. Torstaina alueella räjäytettiin ensimmäinen kenttä. Kentän päällä oli kumiset matot estämässä kivien sinkoilu. Räjäytys oli hallittu ja onnistui kaikin puolin hyvin.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kallionkuorinta- ja louhintatyöt sekä maaleikkaus Soramäessä
- Kallionkuorinta- ja louhintatyöt sekä maaleikkaus Patiokalliolla
- Maa-ainesten sijoitusalueiden valmistelu Okeroisissa
- Suunnittelu on käynnissä
- Liikenteen pysäytykset louhintatöiden vuoksi alkavat Soramäessä ja Nostavantiellä



Patiokallio louhinnan jälkeen.

Viikon onnistumiset

- Ensimmäinen räjäytys Patiokalliolla

Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla Kujalassa valmistui työmaatie maa-aineksen sijoitusalueelle. Launeen koulun takana, Apilakadun varrella, tehtiin varastoaluetta sekä parkkialuetta koulun opettajien käyttöön. Nikulan tulevan eritasoliittymän alueella saatiin puustonpoistotyöt tehtyä. Valtatien 4 eteläpuolella Kujalassa aloitettiin pintamaan poisto tulevan maa-aineksen sijoitusalueen kohdalla. Perjantaina aloitettiin puuston poisto Liipolassa tutkimustunneleille menevien työmaateiden kohdalta, minkä takia osa ulkoilureittiä jouduttiin sulkemaan. Lisäksi perjantaina käynnistyi kantojen poisto Liipolan tulevan betonitunnelin kohdalla.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Launeen koulun kohdalla alkavat johtosiirtotyöt tiistaina
- Tutkimustunnelin louhintatyöt alkavat Liipolassa
- Tutkimustunneleiden työmaateiden rakentaminen käynnistyy
- Liipolan betonitunnelin kohdalla jatkuu kantojen poisto
- Maanantaina tehdään Launeen koulun kohdalla liikennejärjestelyt valmiiksi tiistaina alkavaa johtosiirtotyötä varten. Launeen koulun kohdalla kevyt liikenne siirretään työn ajaksi kulkemaan Ajokadun länsipuolelle ja koulun paikoitusalueelle menevä liittymä suljetaan. Opettajien paikoitusalueelle ajetaan jatkossa Apilakadulta.

Viikon onnistumiset

- Puusto saatiin poistettua Nikulan eritasoliittymän alueelta



Kaivinkone töissä tulevan Liipolan tunnelin läntisen suuaukon edustalla.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyvät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
