


# Vt12 Lahden eteläinen kehätie

## Hankekokonaisuus Top 3

1. Taivaalta saadaan vuorotellen vettä, lunta ja räntää
2. Kehätien suunnitteluratkaisuja lukitaan sekä Hollolan että Lahden päässä
3. Alihankintojen kyselyt käynnissä niin ikään kehätien molemmissa osissa

## Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, työmaalla ei ole sattunut tapaturmia.

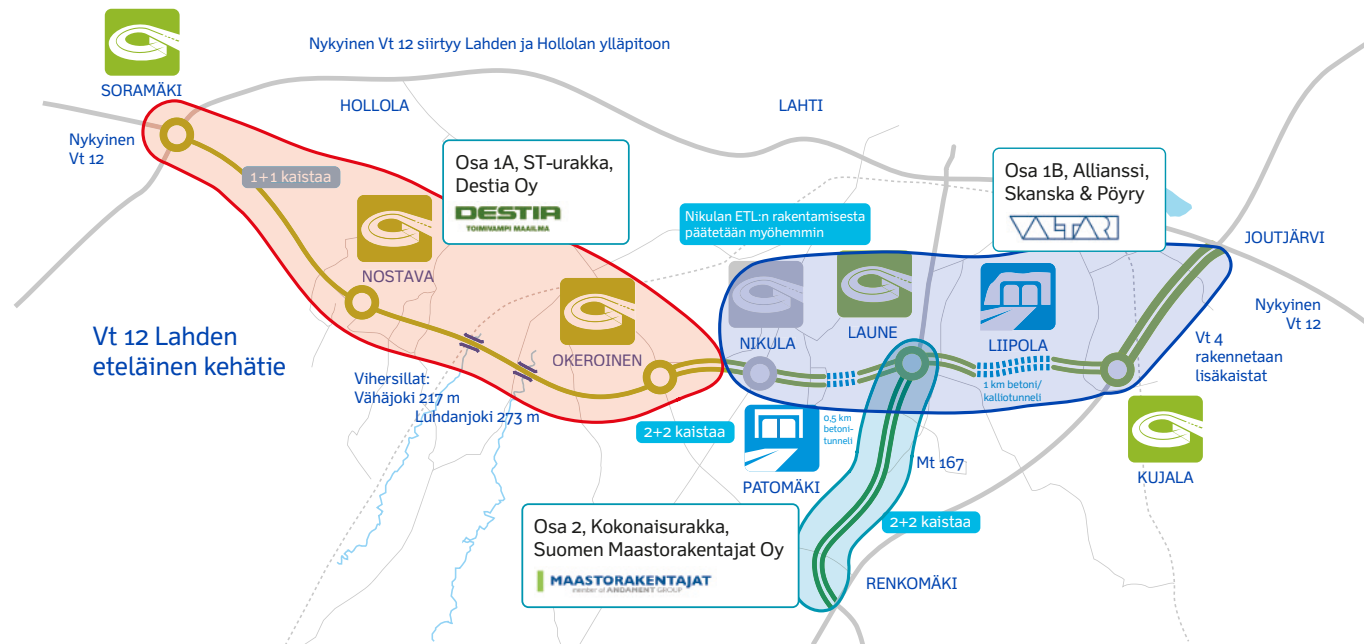

2017

2018

kehätien rakentaminen alkaa

kevät

mt167 2+2

syksy 2019

mt167 valmis

kesä

2020 lopussa  
Vt12 valmis



2021 viimeistelytöitä

2023 viimeinen päällystekerros

## Hankeosa 2

### Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

## Tilannekatsaus

Menneellä viikolla jatkettiin maatöitä muutaman työkoneen voimin vaihtelevien sääolosuhteiden keskellä. Siltatöiden osalta Hankaankadun ja Launeen risteyssilltojen rakentaminen etenee suunnitelman mukaan.

Luhdantaustakadun ja Orimattilankadun kulmalla tehtiin liikennejärjestelymuutoksia, jotta Uudenmaankadun alittavan Kangasmäen alikulkukäytävän rakentamista päästään jatkamaan Uudenmaankadun alle.

Tulevalla viikolla tehdään hienosäätöä Tasangonpolun kulkureittiin Uudenmaankadun kohdalla. Tasangonpolku on edelleen käytettävissä, mutta linjausta muutetaan, jotta vanhan alikulkukäytävän purku ja sitä seuraava uuden rakentaminen voidaan tehdä turvallisesti.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Launeen risteyssillalla jatkuu maatumien ja kannen telineiden rakentaminen
- Hankaankadun risteyssillalla valmistunevat sillan kannen raudoitustyöt
- Nikkilän alikulkukäytävän tuetun kaivannon kaivutyöt jatkuvat
- Kangasmäen alikulun rakentaminen jatkuu ja Launeen alikulun kaivuu aloitetaan
- Tasangonpolun linjausta muutetaan

## Viikon onnistumiset

- Työt etenevät, vaikka sää ei aina suosikaan



Kuvassa asennetaan Nikkilän alikulkukäytävän tukiseinän ankkureita Aukeankadulla.

## Hankeosa 1A

### Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

## Tilannekatsaus

Viikolla rakennussuunnittelu, työnsuunnittelu ja massamäärien tarkastelut jatkuivat. Lisäpohjatutkimukset maastossa ovat loppusuoralla ja niitä jatketaan vielä ensi viikolla. Urakan ST-roumeissa on jälleen syntynyt aihioita ja ideoita suunnitteluratkaisuihin ja työn toteutukseen.



ST Kick Off -tilaisuudessa päätimme rakentaa Vt12 Letke -hanketta hyvässä yhteistyössä, turvallisuuuutta noudattaen ja laadukkaasti.

## Tulevan viikon töitä:

- Vesistötutkimusten valmistelu
- Lisäpohjatutkimukset maastossa jatkuvat
- Suunnittelu jatkuu
- Väylä- ja siltapuolella valmistellaan hankintoja

## Viikon onnistumiset

- Sovittu yhteinen tavoite rakentaa tie hyvässä yhteistyössä, turvallisesti ja laadukkaasti

## Hankeosa 1B

### Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

## Tilannekatsaus

Tällä viikolla pidettiin Hankeosien 1A ja 1B yhteensovituspäätös. Tekniikkaryhmistä viikolla kokoontuivat muun muassa geo-, maisema- ja väyläryhmät sekä liikenteen hallinnan ryhmä. Tunneleiden osalta tarkennettiin rakentamisen aikataulua ja laskettiin rakennuskustannuksia. Lahden kaupungin kanssa suunniteltiin hankintamarkkinoiden järjestämistä. Pohjatutkimuksia tehtiin muun muassa valtatie 4 varressa ja Pippon moottoriturheiluradalla sekä Liipolassa.



Talvista maisemaa Kujalasta.

## Viikon onnistumiset

- Alkuvuikon kaunis talvisää suosi drone-kuvausta

## Tulevan viikon töitä

- Pohjatutkimukset jatkuvat muun muassa Liipolassa Jyrkänkadulla kerrostalojen piha-alueilla
- Suunnittelu jatkuu eri tekniikka-aloilla

## Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaika- taulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyvät vuonna 2018.

### Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

### Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
