
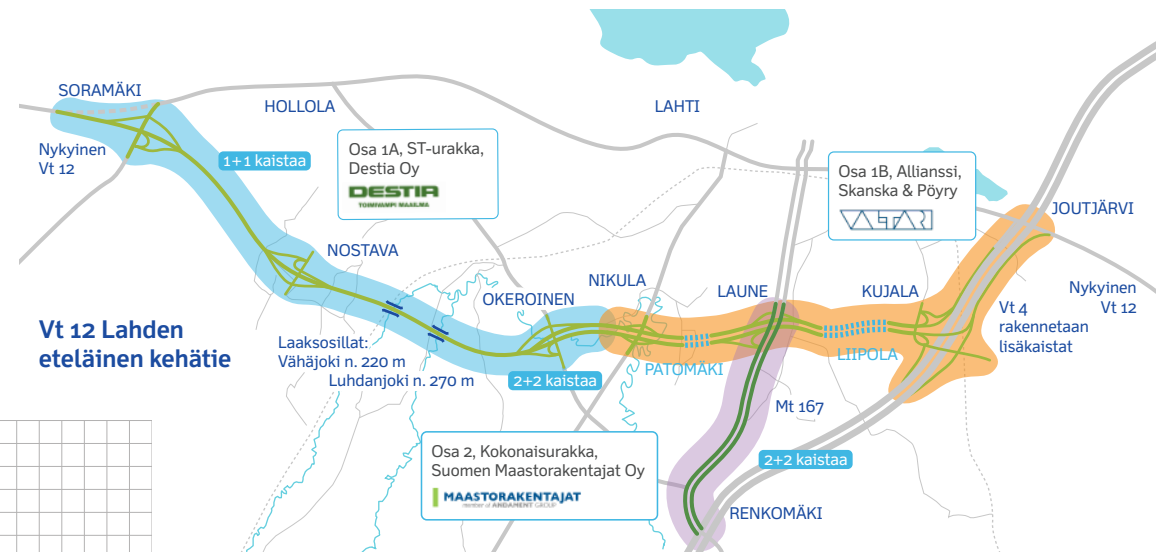


Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Hankekokonaisuus Top 3

1. Soramäessä ja Patiokalliolla ensimmäiset louhintaräjähdykset
2. Kallion poraus käynnissä Liipolassa
3. Kevätaurinko nähty useampana päivänä!

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0,
rakentamisen alusta 344 tapaturmatonta päivää.



Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Siltatyöt etenivät hyvin. Nikkilän alikulkukäytävällä saatiin kaivutyöt valmiiksi, ja ensi viikolla päästään sillan paalutustöihin. Patomäen alikulkukäytävällä valettiin anturat. Launeen alueella raudoitustyöt jatkuivat Launeen risteyssillalla ja Launeen alikulkukäytävällä. Lisäksi valmisteltiin paalulaattapohjia, ja yksi paalulaatta saatiin valettuakin. Kuluneella viikolla toiminta vilkastui jälleen myös maatöiden osalta. Moottoritien liittymän läheisyydessä aloitettiin ajoradan leventäminen. Uudenmaankadun varrella asennettiin tievalaistuksen jalustoja.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Hankaankadun risteyssillan vedeneristystyön valmistelut
- Kangasmäen alikulkukäytävän kohdalla tukiseinätyöt jatkuvat
- Nikkilän alikulkukäytävän tuetussa kaivannossa alkavat paalutustyöt
- Patomäen alikulkukäytävällä kehän muotin rakentaminen
- Launeen risteyssillan ja Launeen alikulkukäytävän kannen raudoitustyöt ja paalulaattojen rakentaminen jatkuvat
- Uuden Orimattilankadun (Mt 296) ja Uudenmaankadun risteyksessä ABC:n kupeessa keskisaarekkeiden purkutöiden ja hulevesikaivojen asentamisen vuoksi kavennetaan/suljetaan kaistoja lyhytaikaisesti

Viikon onnistumiset

- Kangasmäen alikulkusilta purettiin onnistuneesti



Launeen risteyssillalla raudoitustyöt etenevät hienosti aurinkoisessa kevätsäässä.

Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Kuluneella viikolla Soramäessä tehtiin ensimmäiset louhinnat - ensimmäinen räjäytys oli maanantaina. Räjäytys sujui turvallisesti ja hallitusti, ja liikenteen pysäytykset hoidettiin mallikkaasti. Räjäytys kuvattiin myös Yle Hämeen uutisiin, ja sen näyttävyyttä voi käydä ihailmassa Yle Areenassa (uutislähetysten 3. minuutin kohdalla). Soramäessä rakennettiin lisäksi kuivatuksia, tierumpuja sekä leikattiin maata. Viliä oli melkoinen, sillä töissä oli kuusi kaivinkonetta sekä kaksi puskukonetta ja dumpperia, minkä lisäksi kuorma-autot toivat mursketta työmaalle. Patiokalliolla jo viime viikolla alkanut louhinta jatkui kallion yläosan louhinnalla. Tämäkin louhinta sujui turvallisesti ja hallitusti. Patiokalliolla leikattiin lisäksi maata ja kuorittiin kalliota tulevia louhintoja varten.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kallionkuorinta, louhintatyöt, maaleikkaus ja kuivatukset Soramäessä ja Patiokalliolla
- Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
- Suunnittelu on käynnissä



Ensimmäinen räjäytys Patiokalliolla.

Viikon onnistumiset

- Onnistunut louhinta ja liikenteen pysäytykset Soramäessä

Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla aloitettiin johtosiirtotyöt Launeen koulun luona. Apilakadun varrella tehtiin pintamaiden poistoa tulevilla varastoalueella. Liipolan työmaateiden kohdalta kaadetut puut kuljetettiin pois ja paikalla aloitettiin kantojen ja pintamaan poisto sekä murskeen ajo. Kantoja poistettiin myös tiealueelta Kujalassa. Liipolassa käynnistyivät ensimmäisen tutkimustunnelin poraustyöt. Valtarilaiset kävivät kertomassa hankkeesta lahtelaisille Lahden kaupungin järjestämässä Lahden suunta -tapahtumassa. Big Roomissa kävi vierailijoita Raide-Jokeri -allianssista.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Launeen koulun kohdalla tehdään johtosiirtotöitä. Alueen kevyt liikenne on siirretty työn ajaksi kulkemaan Ajokadun länsipuolelle ja koulun paikoitusalueelle menevä liittymä on suljettu. Opettajien paikoitusalueelle ajetaan Apilakadulta
- Ensimmäisen tutkimustunnelin poraustyöt jatkuvat ja louhinta-räjäytykset käynnistyvät
- Työmaateiden rakentaminen jatkuu
- Apilakadun varrella jatkuvat varastoalueen rakennustyöt

Viikon onnistumiset

- Liipolan ensimmäisen tutkimustunnelin poraustyöt käynnistyivät



Tutkimustunnelin poraustyöt käynnissä Liipolassa.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyvät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
