


Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Hankekokonaisuus Top 3

1. Mt167 urakassa saatiin ensimmäiset päällystekerrokset tehtyä
2. Allianssin Big Roomiin saatiin vihdoin kahvikone
3. Hankaankadun risteys sillalla työt etenivät ensimmäisiin valuihin

Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, työmaalla ei ole sattunut tapaturmia.

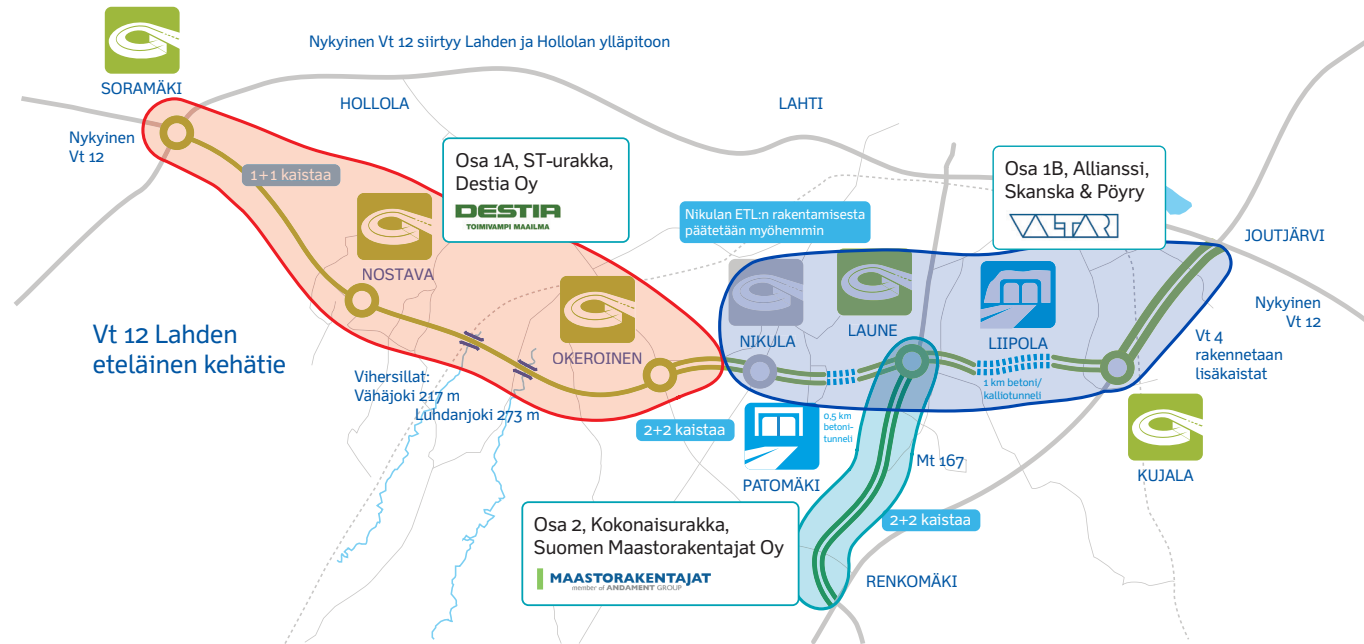

2017

2018

kehätien rakentaminen alkaa

kevät

syksy
mt167 2+2

2019

kesä
mt167 valmis



2021 lopussa
vt 12 valmis

Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Uudenmaankadulle saatiin tehtyä ensimmäiset päällystekerrokset. Lisäksi tehtiin ensi viikolla käyttöön otettavaan Aukeankadun työnaikaiseen kiertoliittymään liittyviä päällystystöitä. Siltapaikoilla työt etenevät edelleen hyvin. Launeen risteyssillalla tehtiin paalulaattojen raudoitus- ja valutöitä. Hankaankadun risteyssillalla valettiin väli-tukien teräspalkkipaaluja, ja raudoitettiin tulopenkereiden paalulaattoja. Tulevan Launeen alikulkukäytävän rakentamisen vuoksi tehtävät Paskurinojan siirtotyöt ovat alkaneet.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Siltojen ja paalulaattojen rakentaminen etenee useassa kohteessa
- Alavankadun kevyen liikenteen väylällä välillä pientä haittaa liikenteelle vesijohto- ja viemäritöiden vuoksi
- Uudenmaankatu / Aukeankatu / Patometsänkatu, työnaikaisen kiertoliittymän käyttöönotto tiistaina 14.11.

Viikon onnistumiset

- Ensimmäinen päällystekerros saatiin tehtyä Uudenmaankadun uudelle ajoradalle



Aukeankadun kiertotie päällystetty.

Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy (urakkasopimusta ei ole vielä allekirjoitettu)

Tilannekatsaus

Hankeosa 1A rakennusurakassa on valmisteltu sopimuskatselmusta. Hankintapäätöksen valitusaika päättyy 10.11.2017 klo 16. Mikäli valituksia ei tule, edetään Destian kanssa sopimuskatselmukseen 14.11.2017.

Hankeosan alueella ei ole tällä hetkellä töitä käynnissä maastossa, eikä näin ollen myöskään tarvetta liikennejärjestelyille.

Tulevan viikon töitä

- Puuston poiston valmistelu

DESTIA
TOIMIVAMPI MAAILMA

Viikon onnistumiset

- Tämänkään viikon aikana ei tullut valituksia hankintapäätökseen (tilanne 10.11. iltapäivällä)

Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla on pidetty eri asian-
tuntijaryhmien kokouksia ja työpajoja,
kuten mm. Patomäki-työpaja ja
maisemasuunnittelun työpaja. Pohja-
vesien koepumppaus on jatkunut
Patomäessä. Luode Consulting Oy
on käynyt luotaamassa Paskurinojan
ja Porvoonjoen uomat. Kujalassa on
jatkettu koepengerten rakentamista.



Paskurinojan uoman luotaus.
Kuva: Luode Consulting Oy/Antti Lindfors



Kujalan koerakenne 1.

Viikon onnistumiset

- Paskurinojan ja Porvoonjoen uomien luotaus

Tulevan viikon töitä

- Taitoryhmä kokous 3
- Tekniset järjestelmät kokous 2
- Koepengerten rakentaminen jatkuu

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Tavoiteaika-
taulun mukaisesti työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyvät vuonna 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektinsiinööri Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
