
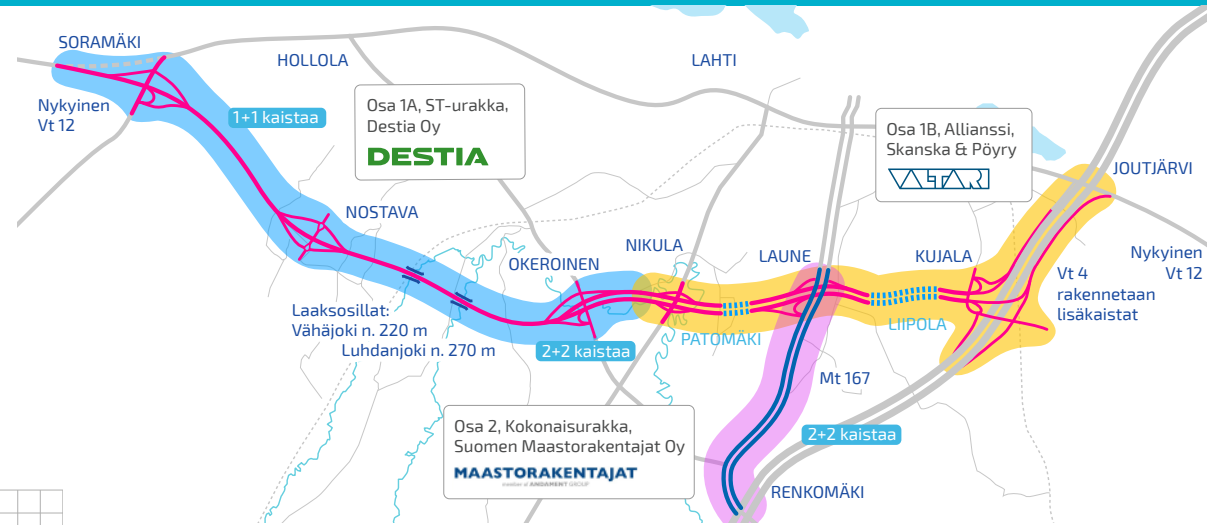


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3

1. Hankkeen väki toivottaa kaikille kaunista juhannusta!
2. Patiokallion tielinjan louhinnat on saatu valmiiksi.
3. Patomäen tunnelissa siirryttiin ensimmäisen holvin valuun.

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, toukokuu: 2,3*

Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

22 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



HANKEOSA 1A

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Valtatien 12 varrella meluesteen viimeistelytyöt jatkuvat. Soramäen risteyssillalla on aloitettu liikuntasauimalaitteen asennustyöt sekä sillan pintarakennetyöt. Takamaalla silta- ja maanrakennustyöt sekä paalulaatan raudoitus ja pohjien teot ovat käynnissä. Vähäjoen sillalla kannen valun jälkeiset hoitotyöt sekä otsamuurin rakentaminen käynnissä. Tielinjan louhinnat Patiokallion leikkauksessa on saatu valmiiksi, tielinjalta louhittiin n.150 metrin matkalta kalliota, leikkaus on korkeimmalta kohdaltaan n. 30 metriä. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla raudoitustyöt ovat alkaneet. Okeroisten risteyssillalla telinetyöt jatkuvat. Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Soramäen kiertoliittymän ja Hollolan Matkakeitaan välisellä tieosuudella etelänpuoleinen ajorata suljettu, käytössä yksi ajokaista molempiin suuntiin
- Soramäen kiertoliittymästä Tampereen suuntaan alennettu nopeusrajoitus 50km/h ja kaistajärjestelyjä
- Soramäessä päällystystyöt uudella tielinjauksella, töistä johtuen lyhytkestoisia liikenteenpysäytyksiä
- Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa
- Soramäen risteyssillalla, Porvoonjoen sillalla ja Ala-Okeroisten sillalla kansien pintarakennetyöt käynnissä
- Okeroisten risteyssillalla kannen telinetyöt käynnissä
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella

HANKEOSA 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla Nikulan eritasoliittymässä on tehty louherakenteita sekä aloitettu kuivatuksen rakentaminen. Ali-Juhakkalan sillalla on jatkettu kansien raudoitustöitä. Jätevesialtaan luona on ollut käynnissä ponttaustyöt. Patomäessä on tehty tunnelin ulkopuolisia täyttöjä ja tunnelin hulevesiviemärintiä sekä jatkettu seinien, anturoiden ja holvien rakentamista. Launeella on jatkettu pohjavesikaukalon rakentamista ja Orvokkitien varrella on ollut käynnissä kiveyksien asennus sekä luiskien ja maavallin muotoilu. Liipolan välitunnelilla jatkuvat tunnelin seinien ja holvien raudoitus- ja raudoitustyöt. Läntisellä suuaukolla on jatkettu louheen lastausta. Kujalan eritasoliittymässä jatkuivat mm. kuivatuksen ja valaistuksen rakentaminen Vanhanradankadulle.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- 26.–27.6. välisenä yönä liikenteen pysäytyksiä valtatiellä 4 Lotilan risteyssillan hiekkapuhalluksen vuoksi
- Louhintoja valtatie 4 varrella – kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä enintään 8 min pysäytyksiä
- Kiviaineksen murskausta jatketaan Liipolan tunnelin itäisellä suuaukolla
- Nikulan eritasoliittymässä maaleikkaus- ja louherakennetyöt ja kuivatuksen rakentaminen
- Orvokkitien kiveyksien teko ja maavallin luiskien muotoilu
- Ajokadulla kiveystyöt alkavat
- Kujalan eritasoliittymässä ramppien, Vanhanradankadun ja siltojen rakennustyöt

Patiokallion louhintatyöt tielinjalta saatu päätökseen.

VIIKON ONNISTUMISET:
Patiokallion louhinta-
työt tielinjalta saatu
pätökseen.

VIIKON ONNISTUMISET:
Patomäen tunnelin
ensimmäinen holvi-
valu käynnissä.

Patomäen tunneli.

HANKEOSA 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Uudenmaankadulla viimeistelytyöt jatkuvat. Aukeankadun kiertoliittymään on ilmestynyt liikennevalopylväitä ja -opastimia. Lopullisia liikennemerkkejä on asennettu tielinjalle. Kiveystöitä on jatkettu Uudenmaankadulla ja alikuluissa. Aukeankadusta pohjoiseen on jatkettu jalankulun ja pyöräilyn väylän rakentamista, ja hulevesipumppaamoja on viimeistelty kolmessa kohtaa.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Venetsian ylikulkusillan eteläpuolella lyhyt kiertotie jalankulun ja pyöräilyn väylällä
- Aukeankadun kohdalla liikennevalojen valmistelevia töitä
- Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
- Luiskien viimeistelyt
- Vihertyöt
- Hulevesipumppaamojen ja -linjojen viimeistelyt
- Alikulkukäytävien viimeistelyitä
- Tukimuurin asennustyöt
- Jalankulun ja pyöräilyn väylien viimeistelyä

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Kangasmäen alikulkukäytävän noppakiveystä.

VIIKON ONNISTUMISET:
Alikulkujen kiveys-
työt etenevät.
