
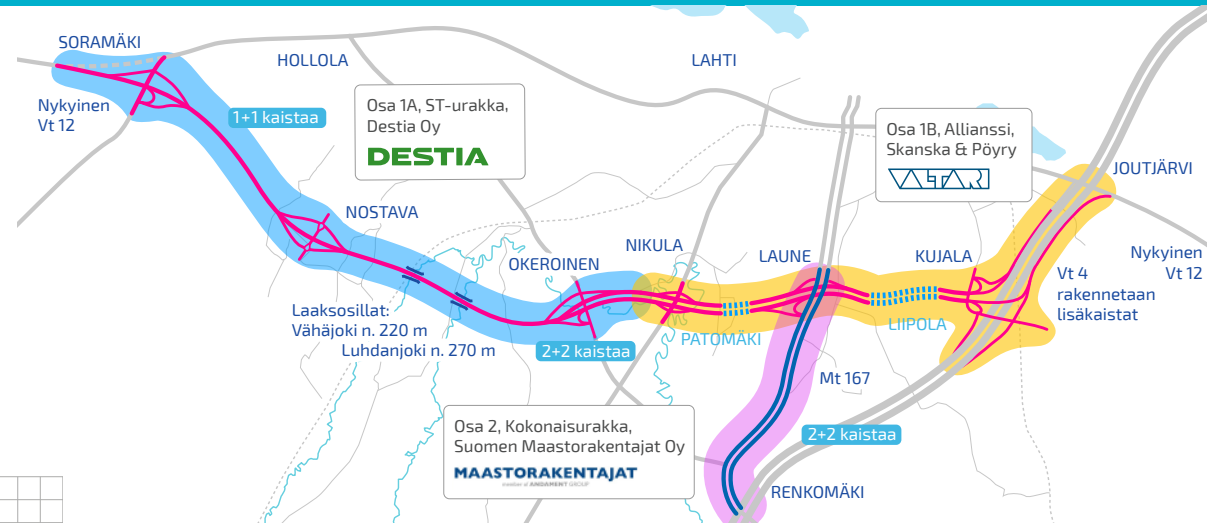


# Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

## Hankekokonaisuus Top 3:

1. Lauantaina 31.8. mahdollisuus tutustua työmaahan kiertoajelulla klo 10–15, lähtö Apilakatu 7
2. Muutoin työmaalla liikkuminen ulkopuolisilta kielletty!
3. Päällystyöt etenevät Hollolan päässä ja Kujalassa

## Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



## Turvallisuus

Tapaturmataajuus, elokuu: 2,8\*

Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

37 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)

\* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



## HANKEOSA 1A

### Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

## Tilannekatsaus

Soramäen eritasoliittymän läheisyydessä on poistettu vanhaa kiertotietä ja aloitettu uuden meluesteen asennustyöt. Hirvikallion ja Takamaan alueilla silta- ja maarakennustyöt etenevät suunnitellusti eteenpäin, murskaustyöt ovat käynnissä Takamaalla. Vähäjoen sillalla on valettu liikuntasaumalaitteet sekä tehty kannen suojabetonia. Hankeosan päällystystyöt ovat edenneet hyvää vauhtia eteenpäin, tällä viikolla mm. Nostavan eritasoliittymän läheisyydessä ja Tikkakalliolla.

Urakoitsija haluaa muistuttaa, että työmaan ulkopuoliset henkilöt eivät saa missään tapauksessa liikkua työmaalla. Vaikka päällisin puolin työmaalla näyttäisi hyvinkin valmiilta, kulku alueella on ehdottomasti kielletty.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Soramäen eritasoliittymän alueella kaistajärjestelyjä
- Kiertotiejärjestelyt Okeroisissa
- Hirviaidan asennusta Soramäki-Takamaan alueella
- Murskaustyöt käynnissä Takamaalla
- Louhintatyöt jatkuvat Takamaan ja Hirvikallion alueilla
- Porapaalutusta Tikkakallion alueella
- Ala-Okeroisten alueella päällystystyöt jatkuvat
- Valaistus-, telematiikka- ja maarakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella

## HANKEOSA 1B

### Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

## Tilannekatsaus

Tällä viikolla on tehty paalutustöitä Kukonkosken sillan sekä Nikulan ramppisillan luona. Nikulan risteys sillan luona on tehty maaleikkauksia ja paalutuspetiä. Patomäen tunnelissa ovat olleet käynnissä holvien raudoitustyöt ja Paskurinojan sillalla hiekkapuhallus. Launeella on rakennettu telematiikkaa ja hulevesilinjaa, tehty maaleikkaustöitä sekä asennettu bentoniittimattoja. Liipolan välitunnelilla ja läntisellä suuaukolla on tehty valutöitä. Kujalan eritasoliittymässä on saatu valmiiksi erikoiskuljetusten kiertoreitti, joka avataan liikenteelle maanantaina. Lisäksi Kujalassa on jatkettu muun muassa luiskien tekoa ja multauksia. Lauantaina VALTARI työmaalla järjestetään kiertoaajelu asukkaille. Tällöin on mahdollista päästä kurkistamaan miltä tienrakentaminen näyttää työmaalta katsottuna.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Louhintoja valtatie 4 varrella – kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä enintään 8 min pysäytyksiä
- Erikoiskuljetusten kiertoreitti käyttöön Kujalassa
- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä siltojen paalutustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Launeella pohjavesisuojaustyöt ja bentoniittimattojen asennus
- Liipolan tunnelin rakennustyöt välitunnelilla ja läntisellä suuaukolla
- Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt

Päällystystyöt etenevät hyvällä tahdilla.



**VIIKON ONNISTUMISET:**  
Päällystystyöt koko hankeosan alueella käynnissä.

**VIIKON ONNISTUMISET:**  
Erikoiskuljetusten kiertoreitti saatu valmiiksi Kujalassa!

Erikoiskuljetusten kiertoreitti valmisteilla Kujalan eritasoliittymässä.



## HANKEOSA 2

# Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

## Tilannekatsaus

Viikon aikana on jatkettu viimeistely- ja korjaustöitä. Kiveystyöt ovat jatkuneet useassa kohtaa. Viimeistelytyötä tehtiin mm. Hankaankadulla. Renkomäessä aloitettiin Hankaankadun risteyssillan vesieristyksen korjaus, mihin liittyen tehtiin kaistajärjestelyjä ennen ABC:n risteystä. Ensimmäinen hulevesipumppaamo saatiin otettua käyttöön. Hulevesipumppaamoita tulee kolme, ja ne sijoittuvat alikulkujen lähelle.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- ABC:n risteuksen eteläpuolella kaistajärjestelyjä
- Muitakin liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Launeen risteyssillan ylittävä kävelyn ja pyöräilyn väylä suljettu, kiertotie Ajokadun kautta
- Hankaankadun risteyssillan vesieristeen korjaus jatkuu
- Päällystystöitä
- Kiveystöitä
- Alikulkukäytävien ja kävelyn ja pyöräilyn väylien viimeistelytyötä
- Bussipysäkkien viimeistelyä
- Siivoustöitä

Hankaankatua ABC:n puolella.



**VIIKON ONNISTUMISET:**  
Hulevesipumppaamojen käyttöönotto.

## LYHYESTI

## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

### Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström  
Väylä  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen  
Väylä  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

### Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
