
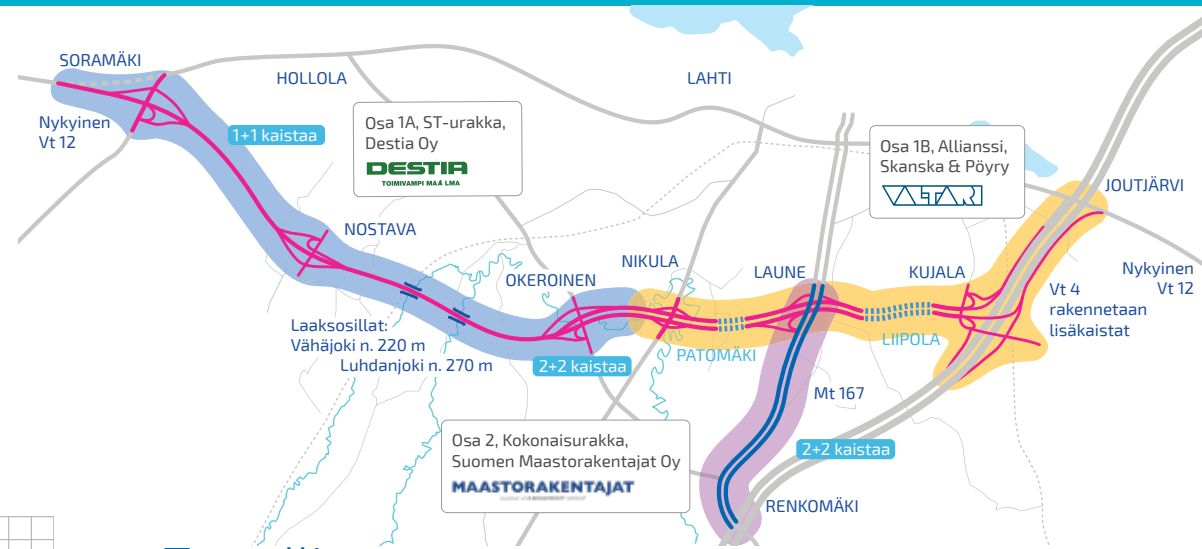


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3

1. Kehätien työt etenevät pakkasesta huolimatta
2. Soramäen risteyssillan työt hyvin eteenpäin
3. Uudenmaankadulla ollaan pääosin talvitaulla

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0*,
rakentamisen alusta 631 tapaturmatonta päivää.

* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



HANKEOSA 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Soramäessä on jatkettu louhintoja Soramäen eritasoliittymän kohdalle tulevan Soramäen alikulkukäytävän osalta. Louhintojen lisäksi alikulkukäytävän rakentamista varten on tehty kuivatusstöitä ja hulevesiviemärointiä. Myös eritasoliittymän risteyssillan pilareita on valettu, ja samalla sillalla on valmisteltu tuen muotti- ja raudoitustöitä sekä tehty täyttöjä ja telinepohjia. Risteyssiltaa pitkin tulee kulkemaan Riihimäentie, joka ylittää kehätien. Takamaalla on lastattu louhetta, ja tulevan Nostavan eritasoliittymän kohdalla on tehty maaleikkausta. Okeroisissa on rakennettu Ulaaninkadun rumpua ja työ valmistuu tällä viikolla. Porvoonjoki ylitetään kahdella sillalla, Ala-Okeroisten silta sijaitsee kehätielle liittyvällä rampilla ja Porvoonjoen silta on itse kehätietä. Viikon aikana Porvoonjoen sillalla on tehty kannen teline- ja muottitöitä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kiertotiejärjestelyt Soramäessä, Okeroisissa ja Nostavantiellä
- Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
- Maarakennustöitä Soramäessä, Nostavantien läheisyydessä ja Patio-kallion ympäristössä sekä Okeroisissa
- Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen töitä Okeroisissa, Soramäessä, Luhdanjoella sekä Vähäjoella

Osmo Huttunen niputtaa esivalmistettuja muottipukkeja kannelle nostamista varten (kuva: Vesa Tompuri)



VIIKON ONNISTUMISET:

Yli puolet Soramäen risteyssillan pilareista on valettu!

HANKEOSA 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla järjestettiin 0-tapaturmaa tilaisuus työmaan väelle kiitoksena, tapaturmattoman vuoden 2018 toteutumisesta. Työmaalle saatiin myös vieraita kun Keudan opiskelijat vierailivat työturvallisuuspäivänään Patomäen tunnelityömaalla. Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla jatkettiin tauon jälkeen poraus- ja louhintatöitä. Johtosiirtotyöt jatkuivat Helsingintien länsipuolella. Ali-Juhakkalan tulevan sillan luona tehtiin paalujen katkaisu- ja raudoitustöitä sekä jatkettiin paalutusta. Patomäen tunnelityömaalla jatkui anturoiden ja seinien laudoitus ja raudoitustyöt sekä anturoiden valu. Launeella tehtiin johtosiirtotöitä sekä rakennettiin hulevesilinjaa. Kujalassa jatkuivat mm. louherakenteiden ja paalulaattojen rakentaminen ja valtatie 4 varrella saatiin valmiiksi louheen kuormausta.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Johtosiirtotyöt Helsingintien länsipuolella
- Kukonkosken sillan luona stabilointipohjan teko
- Ali-Juhakkalan sillan paalujen katkaisu ja raudoitus sekä pilarien muotti ja raudoitustyöt
- Ali-Juhakkalan sillan luona jatkuu paalutus
- Patomäessä jatkuu maaleikkaustyöt ja Patomäen tunnelin anturoiden ja seinien laudoitus, raudoitus ja betonointityöt
- Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla jatkuu poraus ja louhinta, välitunnelin kohdalla maaleikkaustyöt ja liikenne-tunnelin osalta louhinta
- Kujalassa paalulaattojen rakentaminen jatkuu

VIIKON ONNISTUMISET:

VALTARI:n työmaan väelle järjestetty 0-tapaturmaa tilaisuus.

0-tapaturmaa tilaisuudessa saattoi tutustua suojaintoimittajan talvituotteisiin ja miittauttaa silmänpaineen.



HANKEOSA 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Työmaa on vielä pääosin talvitaulla. Kovat pakkaset keskeyttivät osan käynnissä olevista rakennustöistä, ja pääosin on keskitytty ensi kesän töiden työsuunnitteluun ja aikatauluttamiseen.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla rakennetaan hulevesiviemäriä
- Aukeankadun alikulkukäytävän kohdalla valmistellaan työnaikaisia tukiseiniä hulevesipumppaamon rakentamista varten

Aukeankadun työnaikainen kiertoliittymä.



VIIKON ONNISTUMISET:

Talvikunnossapito Uudenmaankadulla toimii hyvin työmaajärjestelyjen keskellä.

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
