
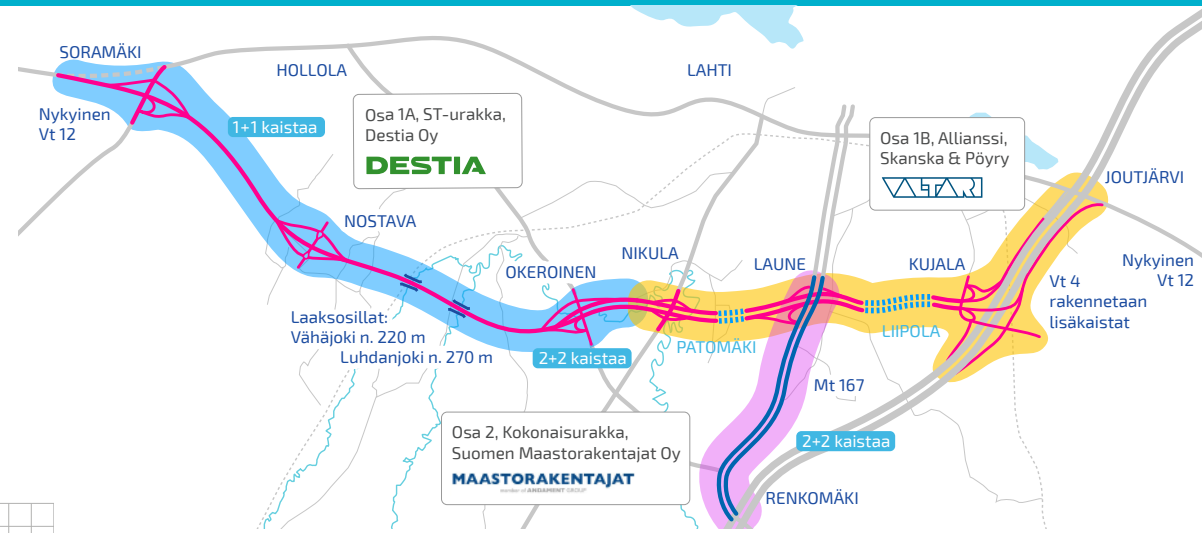


# Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

## Hankekokonaisuus Top 3

1. Yleisötilaisuudet kiinnostivat asukkaita
2. Kehätien päällystystyöt alkoivat Soramäessä
3. Uudenmaankadulla saatiin viimeiset vedeneristystyöt valmiiksi

## Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



## Turvallisuus

Tapaturmataajuus, huhtikuu: 1,3\*

Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

90 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)

\* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



## HANKEOSA 1A

### Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

#### Tilannekatsaus

Päällystystyöt on aloitettu Soramäessä, eli valmista pintaa alkaa pikkuhiljaa tulemaan. Valtatien 12 varrella hankeosan ensimmäiset meluesteet on asennettu ja viimeistelytyöt alueella jatkuvat. Soramäen risteyssillalla jatketaan telineen ja muotin purkutöitä. Takamaalla tehdään silta- ja maanrakennustöitä ja paalulaatan rauditustyöt sekä pohjien teot ovat käynnissä. Vähäjoen sillan kannen rauditustyöt ja päädyn muottityöt ovat käynnissä. Luhdanjoen sillalla tehdään teräsrakenteen kasausta sekä muottitöitä ja Okeroisten risteyssillan telinetyöt ovat alkaneet. Porvoonjoen silloista toisen sillan muottia puretaan ja toisella sillalla ovat rauditustyöt sekä sillan päätyjen tuplaustyöt käynnissä. Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella.

#### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa
- Soramäen kiertoliittymästä Tampereen suuntaan nopeusrajoitus 50km/h ja kaistajärjestelyjä
- Päällystystyöt jatkuvat Soramäessä
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella
- Paalulaatan rakennustyöt Takamaalla
- Luhdanjoen sillalla teräsrakenteen kasausta ja muottitöitä
- Okeroisten risteyssillalla kannen telinetyöt käynnissä

## HANKEOSA 1B

### Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

#### Tilannekatsaus

Tällä viikolla tapasimme asukkaita hankkeen asukastilaisuudessa Liipolassa. Nikulan eritasoliittymässä on jatkettu maaleikkauksia ja louherakenteiden tekoa sekä tehty kaulolämmön työnaikaista siirtoa. Ali-Juhakkalan sillalla on ollut käynnissä muottityöt ja Patomäen tunnelilla jatkuvat seinien ja anturoiden rakentaminen. Paskurinojan sillan luona on tehty anturapohjia. Launeella maaleikkauksia pohjavesikaukalon kohdalla ja ensi viikolla aloitetaan ponttaustyöt. Liipolan välitunnelilla on lastattu louhetta ja tehty anturoiden vierustäyttöjä ja holvimuottia. Tunnelin läntisellä suuaukolla on louhittu ja tehty maaleikkaustöitä. Valtatien 4 varrella on jatkettu hyvin edenneitä louhintatöitä sekä siltojen korjausta. Kujalassa jatkuvat ramppien ja siltojen rakentaminen.

#### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Louhintoja valtatie 4 varrella – kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä enintään 8 min pysäytyksiä
- Ponttaustyöt pohjavesikaukalon kohdalla
- Nikulan eritasoliittymässä maaleikkaus- ja louherakennetyöt
- Ali-Juhakkalan sillan kannen muottityöt ja rauditustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Maaleikkauksien teko Launeella
- Avolouhinta ja poraustyöt Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla
- Liipolan välitunnelilla anturapohjien rakentaminen
- Pipon alikulkusillan muotin purku
- Lepolan ylikulkusillalla vesipiikkaus

Päällystystyöt aloitettu Soramäessä.



**VIIKON ONNISTUMISET:**  
Päällystystyöt  
aloitettu suunnitellun  
aikataulun mukaisesti.

**VIIKON ONNISTUMISET:**  
Louhintatyöt  
sujuvat hyvin  
valtatie 4 varrella.

Louhintatyömaa valtatie 4 varrella



## HANKEOSA 2

# Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

## Tilannekatsaus

Aukeankadun alikulkukäytävällä saatiin vedeneristystyöt valmiiksi, ja samalla valmistuivat urakan kaikki vedeneristykset. Tällä viikolla jatkettiin luiskien viimeistelytyötä ja tehtiin kiveyksiä. Lisäksi viikon aikana jatkettiin sadevesilinjojen rakentamista.

Venetsian ylikulkusillan kohdalla otetaan ensi viikolla jalankulun ja pyöräilyn väylällä käyttöön lyhyt kiertotie vanhan väylän leventämisen vuoksi.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Yksittäisiä liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Aukeankadun työnaikaisen kiertoliittymän luona asfaltointia
- Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
- Luiskien viimeistelyt
- Vihertyöt jatkuvat
- Hulevesilinjojen rakentaminen, hulevesipumppaamojen viimeistelyt
- Alikulkukäytävien viimeistelytyötä
- Siltojen valaisimien asennus
- Kaiteiden asennustyöt

Uudenmaankatua Venetsian sillalta pohjoiseen

### VIIKON ONNISTUMISET:

Viimeiset vedeneristystyöt on saatu tehtyä.

## LYHYESTI

## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

### Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström  
Väylä  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,  
Väylä  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

### Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
