
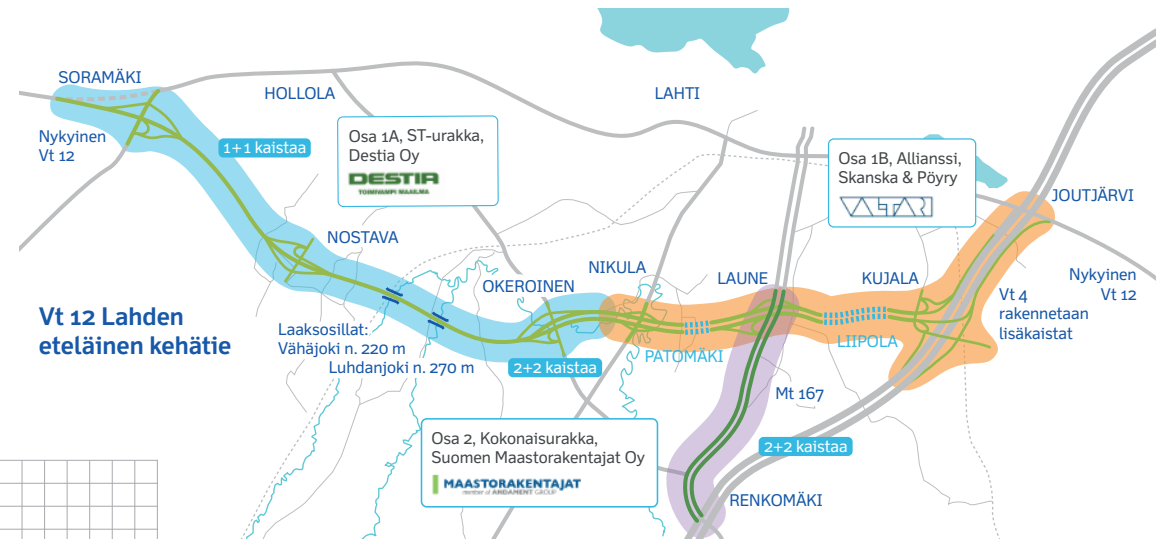


Vt12 Lahden eteläinen kehätie

Hankekokonaisuus Top 3

1. Soramäessä sillankorjauksen liikennejärjestelyt tehty onnistuneesti
2. Kujalassa Liipolan tunnelin itäpäässä alkoi louhinta
3. Launeen risteyssillan sääsuoja valmistui

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, rakentamisen alusta 421 tapaturmatonta päivää.



Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Tällä viikolla on Soramäessä toteutettu työnaikaiset liikennejärjestelyt ja aloitettu sillankorjaustyöt vanhojen siltakaiteiden poistolla. Soramäestä itään on käynnissä louhinta-, massanvaihto- ja maaleikkaustyöt.

Tikkakalliontien läheisyydessä tehdään kuivatusrakenteita, massanvaihtoa, maaleikkausta sekä louhintaa. Myös Vähäjoen sillan ympäristössä on työt hyvässä vauhdissa.

Patiokalliosta itään on tehty useita eri maarakennusvaiheita, kuten mm. pinta-, kallio- ja maaleikkaustöitä. Paalutustyöt ovat jatkuneet Luhdanjoen itäpuolella sekä Okeroisissa. Myös Stabilointityöt ovat jatkuneet. Ala-Okeroisten sillan läntisen paalulaatan raudoitustyöt on saatu valmiiksi.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereet Soramäessä ja Patiokallion ympäristössä
- Patiokalliolla Vähäjoen ylikulkusillan perustusten maatöitä
- Korjaussilloilla kaiteiden poistoa ja uusien kaiteiden asennusta Soramäessä Pässinportin ja Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla
- Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
- Paalulaattojen raudoitustyöt aloitetaan Ala-Okeroistentien itäpuolella

Viikon onnistumiset

- Soramäen sillankorjausten liikennejärjestelyt on toteutettu ajatuksella huomioiden niin tien käyttäjät kuin työmaan ahkerat työntekijät!



Kuvassa sienilaatan pohjarakenne.

Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla on Patomäessä jatkettu maaleikkaustöitä. Ajokadulla Ajokadun risteyssillan kohdalla on tehty maaleikkaustöitä ja johtosiirtotöitä, ja Orvokkitiellä jatkuivat maaleikkaustyöt sekä suojavallin teko. Tunnelilouhinta on jatkunut ensimmäisellä tutkimustunnelilla, ja sen louhinta on edennyt varsinaisen liikennetunnelin louhintaan. Myös toisella tutkimustunnelilla aloitettiin tunnelilouhinta, ja lisäksi Liipolan tunnelin itäpäässä on käynnistynyt avolouhinta. Kujalassa on jatkettu paalutustöitä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Patomäessä maaleikkaustyöt jatkuvat
- Ajokadun risteyssillan paalutustyöt alkavat
- Orvokkitiellä maaleikkaustyöt ja vesijohdon rakentaminen
- Toisen tutkimustunnelin tunnelilouhinta
- Liikennetunnelin itäpään poraus ja louhinta Kujalassa
- Louherakenteiden rakentaminen Kujalassa
- Paalutustyöt jatkuvat Kujalassa
- Liikennejärjestelyt pysyvät ennallaan
 - *Ajokatu suljettu*
 - *Patomäentie suljettu*
 - *Kevyenliikenteen reitti auki välillä Ajokatu – Sokeritoponpolku – Apilakatu*

Viikon onnistumiset

- Louhinta saatu käyntiin Liipolan tunnelin itäpäässä.



Ensimmäinen louhintaräjätys suoritettu Liipolan tunnelin itäpäässä.

Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Uudenmaankadun pohjoispäässä on alkanut paalutus ja viimeinen paalulaatta on tekeillä. Launeen eritasoliittymän risteysillalle asennettiin sääsuojaa juuri sopivasti sateiden ennen sateita. Ajokadun risteuksen luona asennettiin uuden ajoradan alle putkisilta. Hankaankadulla on tehty kaivuutöitä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Hankaankadun kevyenliikenteen väylän rakentaminen sillan alitse
- Kyöstilän ja Aukeankadun alikulkukäytävien kiertoteiden rakentaminen
- Nikkilän alikulkukäytävän raudoitustyöt
- Launeen alikulkukäytävän paalulaatan rakentaminen ja sääsuojan asennus
- Launeen risteysillan kannen muotin purku ja eristystyöt
- Uudenmaankadun uuden ajoradan rakennekerrosten tekoa useassa kohtaa
- Kevyenliikenteenväylä siirtyy kulkemaan Hankaankadun risteysillan alitse ja Aukeankadulla Uudenmaankadun poikki suojatietä pitkin

Viikon onnistumiset

- Launeen risteysillan sääsuojan asentaminen onnistui nopeasti ja sopivasti ennen sateita



Launeen risteysillan sääsuoja valmistumassa.

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
