
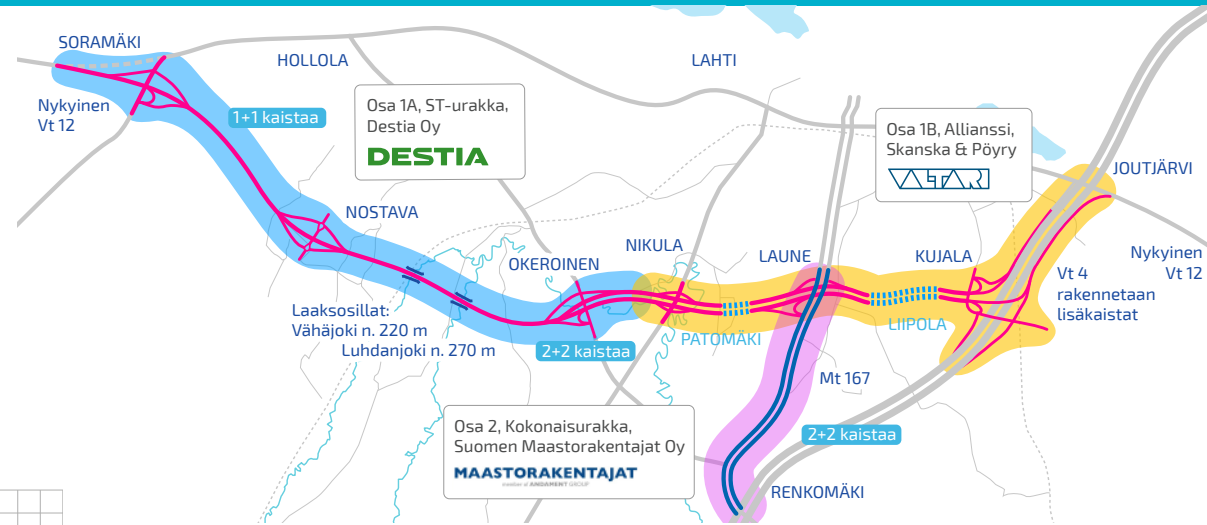


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3

1. Hollolan päässä 2/3 urakan betonimäärästä on valettu.
2. Orvokkitien meluvalli valmistumassa.
3. Uudenmaankadun viimeistelytyöt venyvät alkusyksyyn.

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, toukokuu: 2,3*

Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

30 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



HANKEOSA 1A

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Kesäkuussa tehtiin hankeosan oma ennätys kuukauden aikana valetuissa betoneissa. Betonia valettiin siltoihin ja paalulaattoihin yli 3200m³. Valtatien 12 varrella Tampereen pään meluesteen viimeistelytyöt tien puolelta valmistuivat. Soramäen risteyssillalla liikunta-saumalaitteen raudoitus ja asennustyöt jatkuvat. Sillalla on käynnissä myös vesieristeiden tekeminen teltan suojassa. Soramäessä tien päällystystyöt ovat taas käynnissä. Takamaalla silta- ja maanrakennustyöt sekä paalulaatan raudoitustyöt ovat käynnissä. Vähäjoen sillalla jatkettu sillan kannen valun jälkihoitoa. Patiokallion kallioleikkauksesta on ajettu louhetta tien penkereisiin Okerosiin. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla raudoitustyöt ovat täydessä vauhdissa ja Okeroisten risteyssillan telinetyöt ovat jo loppusuoralla. Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Soramäen kiertoliittymän ja Hollolan Matka-keitaan välisellä tieosuudella etelänpuoleinen ajorata suljettu, käytössä yksi ajokaista molempiin suuntiin
- Soramäen uuden tielinjauksen päällystystyöt jatkuvat ja kiertoliittymästä Tampereen suuntaan alennettu nopeusrajoitus 50km/h ja kaistajärjestelyjä
- Soramäen risteyssillalla, Porvoonjoen sillalla ja Ala-Okeroisten sillalla kansion pintarakennetyöt käynnissä
- Okeroisten risteyssillalla kannen telinetyöt ja muuttotyöt loppusuoralla ja kannen raudoitustyöt alkavat
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella, Soramäessä valaisinpylväiden asennukset alkavat loppuviikolla

HANKEOSA 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla Nikulan eritasoliittymässä on rakennettu muun muassa meluvallia, tehty Kukonkosken sillan maatöitä sekä valtatie 12 maaleikkauksia. Ali-Juhakkalan sillalla on ollut käynnissä muotin purku. Patomäessä tunnelin rakentaminen etenee. Istutuksiin käytettävän kasvualustan tekeminen Starkin vieressä päättyy tällä viikolla ja mullan seulonta siirtyy Kujalan eritasoliittymään. Orvokkitien vallin muotoilu ja kiveystyöt ovat edenneet hienosti ja kiveystöitä aloitettu myös Ajokadulla. Liipolan tunnelissa työt jatkuvat ja läntisellä suuaukolla on lastattu louhetta, tehty massanvaihtoa sekä anturapohjia. Itäisellä suuaukolla aloitettiin kiviaineksen murskaus. Huovilanmäen risteyssillalla on rakennettu telttaa ja Kujalan risteys- ja ylikulkusillalla on ollut käynnissä vesipiikkaus.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Louhintoja valtatie 4 varrella – kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä enintään 8 min pysäytyksiä
- Ali-Juhakkalan sillan toisen kannen valu
- Nikulan eritasoliittymässä käynnissä maaleikkaus- ja louherakennetyöt sekä kuivatuksen rakentaminen
- Orvokkitiellä ja ajokadulla kiveyksien teko ja luiskien muotoilu
- Kujalan eritasoliittymässä ramppien, Vanhanradankadun ja siltojen rakennustyöt
- Mullan seulonta alkaa Kujalan eritasoliittymässä
- Telematiikan rakentaminen valtatiellä 4

Telttailukesä kuumimmillaan Soramäessä.



VIIKON ONNISTUMISET:

2/3 hankeosan
betonimäärästä
valettu.

VIIKON ONNISTUMISET:

Orvokkitien vallin
rakentaminen sujuu
hyvin.

Kuvassa Orvokkitien valli.



Tilannekatsaus

Uudenmaankadulla viimeistelytyöt jatkuvat, mutta valmistuminen on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta alkusyksyyn. Risteysalueiden viimeistelytyötä aloitettiin jyrsimällä vanhoja asfaltteja. Kesän aikana kaikilla risteysalueilla tehdään tasauksen muutoksia ja uudet asfalttikerrokset Liikennevalojen asennustyöt ovat jatkuneet Aukeankadun risteyksessä. Kiveystöitä on jatkettu alikuluissa, ja istutukset ovat täydentyneet pensailta. Hulevesipumppaamoihin liittyvät viimeistelyt jatkuvat. Luiskien viimeistelyä on tehty myös Hankaankadulla.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Launeen risteyssillan ylittävä kävelyn ja pyöräilyn väylä suljetaan, kiertotie Ajokadun kautta.
- Hankaankadulla aloitetaan autoliikkeen uuden liittymän teko
- Päällystystöitä risteysalueilla
- Aukeankadun kohdalla liikennevalojen valmistelevia töitä
- Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
- Luiskien viimeistelyt, vihertyöt
- Hulevesipumppaamojen ja -linjojen viimeistelyt
- Alikulkukäytävien ja kävelyn ja pyöräilyn väylien viimeistelytyötä
- Valaistuksen asennusta
- Bussipysäkkien viimeistelyä

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke

 facebook.com/vt12letke

 twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Tukimuuria Patomäen alikulkukäytävän kohdalla.



VIIKON ONNISTUMISET:
Viimeinen tukimuuri
on asennettu.
