
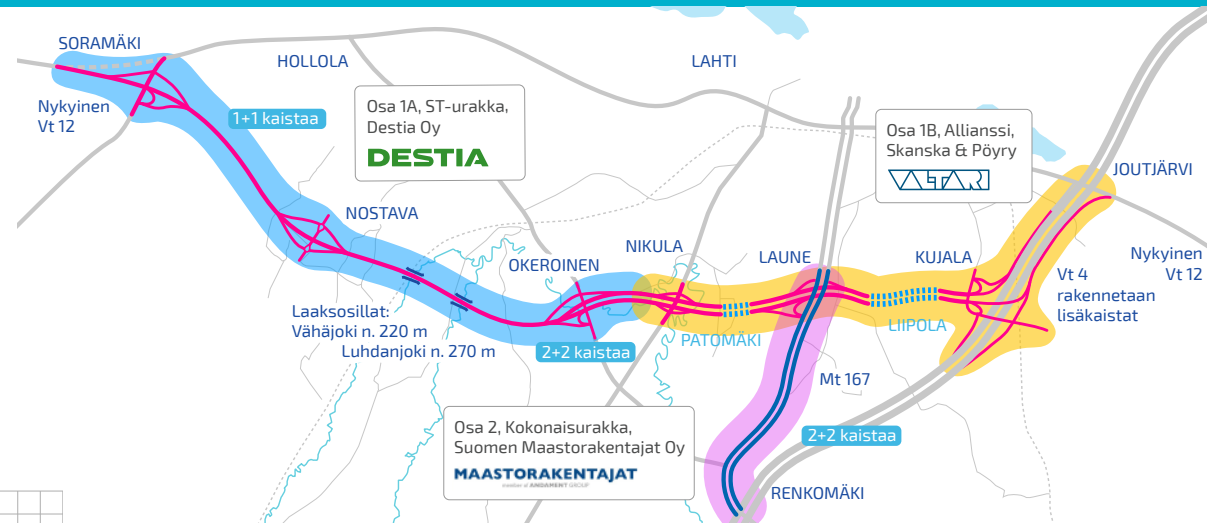


# Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

## Hankekokonaisuus Top 3

1. Kujalan eritasoliittymän ramppien asfaltointityöt aloitettiin.
2. Okeroisissa päällystystyöt pääsevät alkamaan ensi viikolla.
3. Kehäsiltojen koristerimoitusten asentaminen etenee hyvin.

## Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



## Turvallisuus

Tapaturmataajuus, kesäkuu: 2,2\*

Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

51 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)

\* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



## HANKEOSA 1A

### Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

## Tilannekatsaus

Soramäen uuden eritasoliittymän alueella on käynnissä valaisinpylväiden ja portaalien asennustyöt. Soramäen risteyssillalla tehdään viimeistelytyötä, ensi viikolla silta päästään päällystämään. Takamaalla silta- ja maanrakennustyöt ovat jatkuneet. Vähäjoen sillalla on käynnissä kaiteiden ja sääsuojan asennus sekä muotin purkutyöt. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla raudoitetaan. Okeroisten risteyssillalla on käynnissä teline- ja muottityöt sekä sillan raudoitustyöt. Okeroisissa on jatkettu asfalttipohjien tekoa ja päällystystyöt pääsevät alkamaan ensi viikolla. Hankeosan kaikilla eristetyillä silloilla on nyt valettu suojabetonit kermieristyksen päälle, tällä viikolla on suojabetonointia tehty Soramäessä ja Okeroisissa kahdella sillalla.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Soramäen kiertoliittymän ja Hollolan Matkakeitaan välisellä tieosuudella eteläpuoleinen ajorata suljettu, käytössä yksi ajokaista molempiin suuntiin
- Soramäen kiertoliittymästä Tampereen suuntaan alennettu nopeusrajoitus 50 km/h, kaistajärjestelyjä, viikolla 30 alueella otetaan käyttöön työnaikaiset liikennevalot
- Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa
- Soramäen eritasoliittymän alueella viimeistelytyötä mm. kaiteiden, portaalien ja liikennemerkkien asennusta
- Louhintatyöt käynnissä Takamaan alueella
- Okeroisten risteyssillalla kannen teline-, muotti- ja raudoitustyöt käynnissä
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella

## HANKEOSA 1B

### Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

## Tilannekatsaus

Tällä viikolla on jatkettu Helsingintien kiertotien rakennustöitä. Nikulankadun ja Porvoonjoentien muutostyöt etenivät päällystysvalmiuteen tällä viikolla, ja Ali-Juhakkalan sillan muottien purkutyöt jatkuivat. Porvoonjoentiellä on jatkettu kaukolämpöputkien asennuksia sekä tunnelin ajoratojen jakavan kerroksen rakentamista. Patomäen tunnelilla on valettu yksi 16 metriä pitkä osa kannesta. Nyt tunnelin kantta on valmiina 61 metriä, joka on reilu 15 % tunnelin koko mitasta. Ajokadun sillan kiveystyöt jatkuvat vielä ensi viikon ajan. Liipolan läntisellä suuaukolla on tehty pohjoisen seinämän louhintaa. Kujalassa murskaus ja mullan seulonta jatkuvat seuraavaan viikkoon. Kujalan risteyssillan muottityöt valtatie 4 ajoratojen ylle on aloitettu tällä viikolla ja jatkuvat vielä neljä viikkoa. Sillan kannen raudoitukset etenevät sitä myöten, kun muottia valmistuu.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Louhintoja valtatie 4 varrella – kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä enintään 8 min pysäytyksiä
- Patomäen länsipään avo-osuuden maaleik- kaukset sekä tunnelin muotti- ja raudoitustyöt
- Patomäen tunnelin laittilojen väliset telematiikkaputkitukset jatkuvat
- Porvoonjoentien kaukolämpöputkien asennus jatkuu
- Launeella jatkuu louherakenteen teko
- Ajokadun luiskien multaus alkaa ja kiveystyöt jatkuvat
- Kalliotunnelissa jatketaan tunnelin laittilan pohjatöitä
- Liipolassa välitunnelin betonirakenteen tekeminen jatkuu
- Kujalassa jatkuvat murskaustyöt ja eritasoliittymän rakentaminen
- Lotilan risteyssillan varustelu alkaa
- Siltojen vesieristyksiä

Ala-Okeroisten sillalla käynnissä suojabetonin valu.



**VIIKON ONNISTUMISET:**  
Hankeosan kaikilla eristetyillä silloilla suojabetonit valettu.

**VIIKON ONNISTUMISET:**  
Kujalan eritasoliittymän ramppien asfaltointityöt aloitettiin.



## Tilannekatsaus

Uudenmaankadulla viimeistelytyöt jatkuvat. Päällistykset jatkuivat yötöinä kohti keskustaa. Tulevalla viikolla työlliställä on Aukeankadun liittymä. Aukeankadun risteyksessä liikennevalot ovat käyttöönottovalmiudessa, kun risteuksen päällistykset saadaan tehtyä. Viimeistelytöinä on edelleen jatkettu myös mm. kiveystöitä ja vihertöitä. Hankaankadulla on tehty autoliikkeiden uutta liittymää. Pientä jobinpostia kuuluu Hankaankadun risteyssillalta, jossa joudutaan korjaamaan pientä vesieristeeseen liittyvää ongelmaa.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Aukeankadun risteyksessä liikennevalojen käyttöönotto
- Liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Launen risteyssillan ylittävä kävelyn ja pyöräilyn väylä suljettu, kiertotie Ajokadun kautta.
- Hankaankadulla autoliikkeiden uuden liittymän teko
- Päällistystyöt
- Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
- Vihertyöt
- Hulevesipumppaamojen ja -linjojen viimeistelyt ja käyttöönotto
- Alikulkukäytävien ja kävelyn ja pyöräilyn väylien viimeistelytöitä
- Valaistuksen asennusta
- Bussipysäkkien katosten asennus

## Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

### Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström  
Väylä  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,  
Väylä  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

### Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

Uudenmaankadun alittaviin kehäsiltoihin asennetaan koristerimoitukset.

**VIIKON ONNISTUMISET:**  
Kehäsiltojen koristerimoitusten asentaminen etenee hyvin.
