
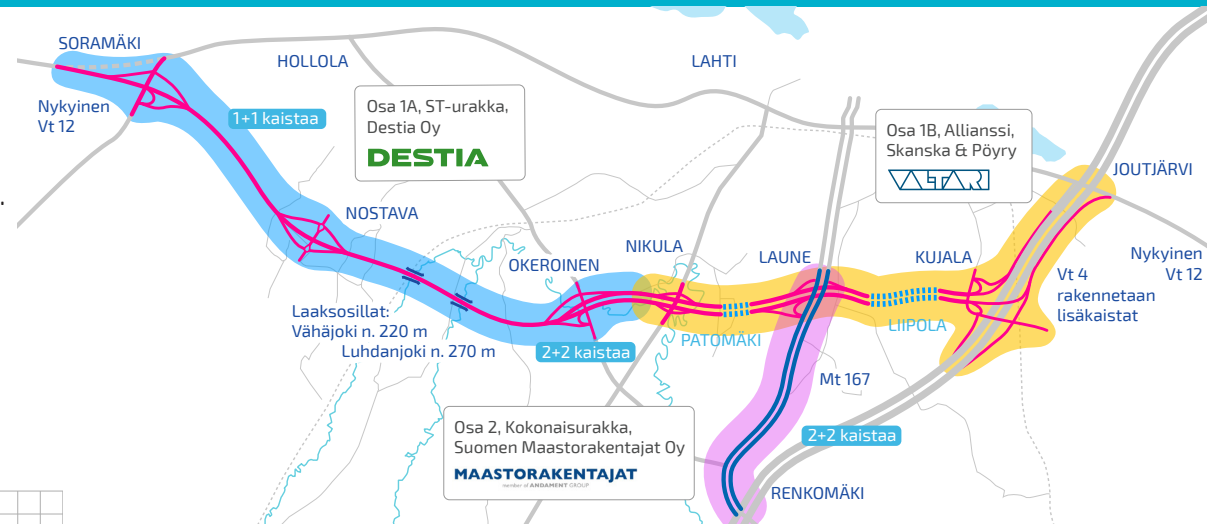


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3

1. Hankekokonaisuuden alueella on tapahtunut kolmas työtaturma, jonka seurauksena työntekijä sai aivotärähdyksen. Työtaturmasta aiheutuu arviolta kolmen päivän poissaolo.
2. Kehätien asfaltoinnit etenevät.
3. Patomäen betonitunnelille saatu jälleen yksi holvi valettua.

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, kesäkuu: 3,2*

Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

2 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



HANKEOSA 1A

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Soramäen uuden eritasoliittymän alueella on jatkettu asfaltointea, ja eritasoliittymän alueella tehdään viimeistelyjä, kuten kiveys- ja vihertöitä. Myös eritasoliittymän alueelle tehtävien opastusmerkkien ja valaisinten asennukset alkavat olla loppusuoralla. Hirvikalliolla ja Takamaalla silta- ja maanrakennustyöt ovat jatkuneet ja Nostavan risteyssillan rakentamistyöt on aloitettu. Vähäjoen sillalla on sääsuojan asennus lähes valmis ja sillan vesieristystyöt saadaan pian alkuun. Sillan alapuolella puretaan muottia ja sillan maise-mointityöt on aloitettu. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla raudoitusta viimeistel-lään ja valuun valmistautuminen on käynnissä. Okeroisten alueella on ensimmäiset asfaltit tehty suunnitellusti ja siltojen rakentaminen jatkuu. Okeroisten risteyssillalla ovat teline- ja muottityöt sekä sillan raudoitustyöt täydessä vauhdissa, muilla eritasoliittymän alueen silloilla tehdään pintarakenteita ja varusteluita.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Soramäen kiertoliittymän ja Hollolan Matka-keitaan välisellä tieosuudella etelänpuolei-nen ajorata suljettu, käytössä yksi ajokaista molempiin suuntiin
- Soramäen kiertoliittymästä Tampereen suuntaan alennettu nopeusrajoitus 50 km/h, kaistajärjestelyitä, viikolla 30 alueella otettu käyttöön työnaikaiset liikennevalot, työ jatkuu tulevalle viikolla
- Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroi-sissa, Soramäen eritasoliittymän alueella asfaltointitöitä sekä viimeistelyitä
- Louhintatyöt käynnissä Takamaan/Hirvi-kallion alueella
- Okeroisten risteyssillalla kannen teline-, muotti- ja raudoitustyöt käynnissä
- Valaistus-, telematiikka- ja maanraken-nustyöt ovat käynnissä koko hankealueella

VIIKON ONNISTUMISET:
Okeroisten alueen ensimmäiset valtatie asfaltit tehty.

HANKEOSA 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus


Ali-Juhakkalan sillan ympärillä on Helsingintien kiertotien rakentaminen täydessä vauhdissa. Sillalla ovat käynnissä eristystyöt ja väylillä päällysrakenne- ja varustelutyöt. Patomäen tunnelin länsipäässä ovat maaleikkaustyöt käynnissä tielinjalla ja jätevesialtaalla. Patomäen tunnelilla valettiin keskiviikkona jälleen yksi 16 m pitkä osa tunnelin kannesta. Launeella on tehty louherakennetta ja valmisteltu pohjavesisuojausrakenteita. Ajokadun sillan luiskien multaustyöt jatkuvat ensi viikolle. Liipolan betonitunnelilla on tähän mennessä valettu kaksi 16 metrin pituista tunnelin osaa. Kujalassa murskaus on saatu tältä osin tehtyä, kun taas mullan seulonta jatkuu vielä ensi viikkoon. Kujalan risteyssillan muotti- ja raudoitustyöt jatkuvat.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Louhintoja valtatie 4 varrella – kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä enintään 8 min pysäytyksiä
- Patomäen länsipään avo-osuuden maaleikka-ukset sekä tunnelin muotti- ja raudoitustyöt
- Nikulassa paalutetaan ja aloitetaan kantavien kerrosten teko
- Lepolan läntisenpuolen ylikulkusillan siltaele-menttien asennus
- Orvokkietien luiskien multaukset jatkuvat ensi viikolla
- Launeella pohjavedensuojaustyöt ovat eden-neet bentoniittimattojen asennusvaiheeseen
- Kujalassa tehdään siltojen vesieristystä, jatketaan mullan seulontaa ja risteyssillan jänneputkien asennukset alkavat
- Kujalan eritasoliittymän ramppien multaus alkaa
- Työmaateiden kastelu jatkuu säännöllisesti ja sitä on lisätty kuivan sään johdosta
- Soramäkeen asennetaan kameramasto

VIIKON ONNISTUMISET:
Patomäen betonitunnelille saatu jälleen yksi holvi valettua.

Liipolan tunnelit 22.7.2019

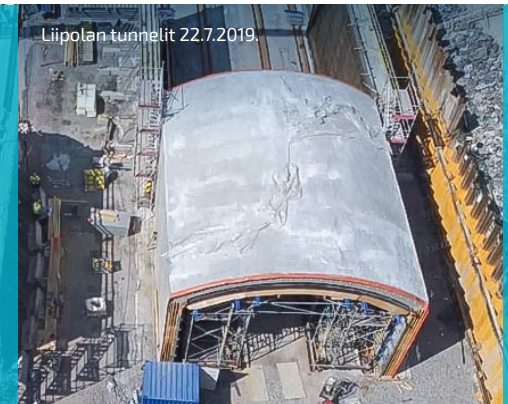

HANKEOSA 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Helteinen viikko kului Uudenmaankadulla lähinnä viimeistelytöiden parissa. Liittymäalueille syntyi ajoratamerkintöjä ja kiveys- sekä vihertyöt etenivät taas vähitellen eteenpäin. Bussipysäkeille asennettiin katoksia ja hulevesipumppaamojen käyttöönottojen valmistelu eteni viikon mittaan. Tulevalla viikolla jatketaan keskeneräisten paikkojen viimeistelyä ja Aukeankadun liikennevalojen käyttöönottoa.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Aukeankadun risteyksessä liikennevalojen käyttöönotto jatkuu
- Liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Launeen risteys sillan ylittävä kävelyn ja pyöräilyn väylä suljettu, kiertotie Ajokadun kautta
- Päällystystyöt
- Reunakivien ja kiveysten asennustyöt
- Vihertyöt
- Hulevesipumppaamojen ja -linjojen viimeistelyt ja käyttöönotto
- Alikulkukäytävien ja kävelyn ja pyöräilyn väylien viimeistelyitä
- Valaistuksen asennusta

Uudenmaankadun ja Ajokadun liittymä Patoniityn ylikulkusillalta.



VIIKON ONNISTUMISET:
Maalarit kävivät tekemässä ajoratamerkintöjä.

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström (lomalla vkot 31–33)
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
