



Vt 12 Lahden eteläinen kehätie

Hankekokonaisuus Top 3

1. Liikenne pois kiertotieltä Renkomäen ABC:n kohdalla
2. Tunnelilouhinta käynnistyi myös Liipolan itäisellä suuaukolla
3. Valutyöt etenevät hyvin kehätiellä

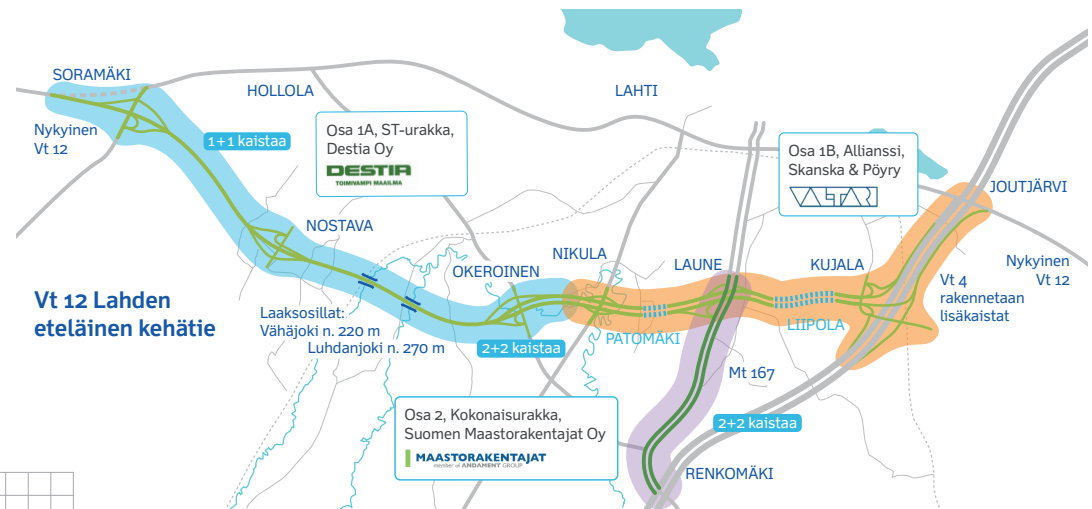

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0*, rakentamisen alusta 575 tapaturmatonta päivää.

* Tapaturmataajuuteen lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



Hankeosa 1A

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Tällä viikolla on valettu antura sekä paaluja Luhdanjoen sillalla. Lisäksi Okeroisten alueen silloilla on tehty muotituksia, raudoituksia ja kannen telinetöitä. Okeroisten päässä on käynnissä myös paalulaatan pohjatyöt, maaleikkaus ja louhepenkereiden kanttaus. Patiokalliolla on louhittu, ja Takamaalla paalutukset, maaleikkaukset sekä louhinnat ovat jatkuneet. Soramäessä aloitettiin porapaalutustyöt tulevan Soramäen risteyssillan tuen alle. Samalla siltatyömaalla on myös rammeroitu tulevan sillan anturoiden pohjia tasaisiksi tulevia anturaperustuksia varten. Rammerointi on slangisana hydrauliselle iskuvasaralle ja se on syntynyt sanasta rammer. Hydraulisia iskuvasaroita voi liittää kaivinkoneisiin ja niitä käytetään betonin, luonnonkiven ja roudan rikkomiseen.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Ensi viikon perjantaina 7.12 pidämme hengähdystauon ja työmaalla ei tehdä töitä
- Liikennejärjestelyt säilyvät ennallaan
- Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereiden teko jatkuvat Soramäessä, Nostavantien läheisyydessä ja Patiokallion ympäristössä
- Siltojen anturoiden, pilareiden ja kannen töitä Okeroisissa, Luhdanjoella sekä Vähäjoella

Viikon onnistumiset

- Tällä viikolla valutyöt ovat onnistuneet hyvin!



Kuvassa on käynnissä Vähäjoen sillan pilareiden valu

Hankeosa 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla on saatu valettua VALTARI:n osuudella toinen silta, Huovilanmäen risteyssilta. Huovilanmäen risteysilta sijaitsee Kujalan eritasoliittymässä ja sitä pitkin nykyinen Vanhanradankatu tulee jatkumaan valtatie 12 yli. Viikolla aloitettiin tunnelilouhinta Liipolan tunnelin itäisellä suuaukolla. Lisäksi louhinta on jatkunut Liipolan tunnelissa ja valtatie 4 varrella. Kukonkosken siltojen ympäristössä on valmisteltu ensi viikolla alkavia pohjanvahvistustöitä. Ali-Juhakkalan siltaa varten tehtiin teräspalkkipaalutusta ja Patomäessä rakennettiin tunnelin anturapohjia. Maaleikkaustöitä on jatkettu Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla sekä Launeen risteyssillan länsipuolella. Kujalassa on jatkettu maaleikkauksia ja louherakenteiden tekoa.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kukonkosken siltojen pohjanvahvistustyöt alkavat
- Patomäessä paalutus ja työmaatien teko tulevan tunnelin eteläpuolelle jatkuu
- Launeen eritasoliittymässä maaleikkaustyöt
- Ajokadulla risteyssillan kannen eristäminen ja kadun rakentaminen jatkuu
- Liipolan välitunnelin kohdalla porataan jätevesiviemäri, läntisellä suuaukolla jatkuu maakaivu ja louheen lastaus, ja Liipolan tunnelissa, itäisellä suuaukolla sekä valtatie 4 varrella jatkuu louhinta
- Kujalan eritasoliittymässä valtatie 4 ylittävän Lotilan risteyssillan kannen raudoitus
- Huovilanmäen risteyssillan kannen teline ja muotin purku

Viikon onnistumiset

- Huovilanmäen risteyssillan valu



Valu käynnissä Huovilanmäen risteyssillalla

Hankeosa 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Tällä viikolla tehtiin muutoksia liikennevaloihin liittyen. Venetsian risteyksessä (Uudenmaankadun ja Ajokadun risteys) otettiin käyttöön työnäkainen kiertoliittymä liikennevalojen uusimisen ajaksi. Loppuviikosta saatiin käyttöön lisää kaistakapasiteettia urakan eteläosassa, kun kiertotie poistui käytöstä Kyöstilän alikulkukäytävän kohdalla. Etelän suuntaan Renkomäen ABC:n liikennevaloristeyksen läpi kulkee nyt kaksi kaistaa.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Apilakadun risteyksessä otetaan liikennevalot takaisin käyttöön ja keskustaan tuleva liikenne ohjataan omalle ajoradalleen. Muutos tehdään alustavasti ma-ti yönä 3.-4.12., säävaraus
- Venetsian risteyksessä rakennetaan liikennevaloja
- Useassa kohtaa tehdään kantavaa kerrosta ja tehdään päällystystöitä

Viikon onnistumiset

- Liikenne pois kiertotieltä Uudenmaankadun eteläpäässä



Renkomäen ABC:n liikennevaloristeyksen läpi etelään kulkee nyt kaksi kaistaa

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström
Liikennevirasto
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Liikennevirasto
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



[twitter.com/vt12letke \(@Vt12Letke\)](https://twitter.com/Vt12Letke)
