
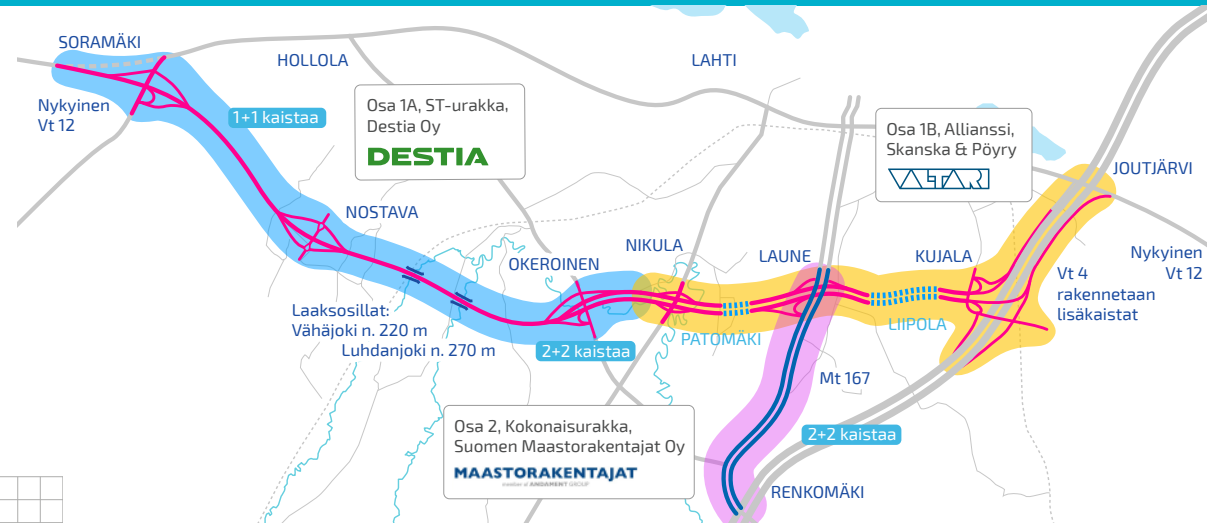


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3:

1. Helsingintie siirtyi kiertotielle Nikulassa.
2. Kehätien pisin, Nostavantien ylittävä Luhdanjoen silta valettu.
3. Soramäessä kehätien ensimetrit otettu sujuvasti käyttöön.

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, heinäkuu: 3,0*

Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

30 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



HANKEOSA 1A

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Soramäen eritasoliittymän uudet liikennejärjestelyt on otettu sujuvasti käyttöön. Eritasoliittymän läheisyydessä on poistettu vanhaa kiertotietä ja valmistaudutaan meluesteen asennustöihin. Hirvikallion ja Takamaan alueella silta- ja maarakennustyöt etenevät hyvällä tahdilla eteenpäin, murskaustyöt ovat käynnissä Takamaalla. Vähäjoen sillalla liikuntasuomalaitteen asennustyöt ovat jatkuneet. Hankeosan ja samalla koko kehätien pisin silta (280m) Luhdanjoen silta valettiin tällä viikolla. Ala-Okeroistentien vierellä uuden kiertoliittymän sekä kävelyn ja pyöräilyn väylän louherakenteen teko on käynnissä. Okeroisten risteys sillalla muotin purkutyöt ovat alkaneet.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Soramäen eritasoliittymän alueella kaistajärjestelyjä
- Tikkakallion ja Nostavan eritasoliittymän alueella päällystystyöt alkavat, josta johtuen työmaaliikennettä Tikkakalliontiellä
- Kiertotiejärjestelyt Okeroisissa
- Hirviaidan asennusta Soramäki-Takamaan alue
- Murskaustyöt käynnissä Takamaalla
- Louhintatyöt jatkuvat Patiokallion, Takamaan ja Hirvikallion alueilla
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella

HANKEOSA 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla rakennettiin kiivaasti Helsingintien kiertotietä valmiiksi ja kiertotie saatiin käyttöön keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Kukonkosken sillalla alkoivat paalutukset, jotka kestävät ensi viikkoon. Porvoonjoella on rakennettu eroosiosuojausta. Nikulan eritasoliittymässä tehtiin maaleikkauksia ja louherakennetta. Maaleikkauksia on tehty myös Patomäessä. Patomäen tunnelissa seinät ja anturat on valettu ja holvien valut jatkuvat. Launeella on rakennettu hulevesilinjaa, tehty maaleikkauksia pohjavesisuojausten kohdalla ja jatkettu bentoniittimattojen asennusta. Betonitunneliosuuksien rakentaminen on jatkunut Liipolan tunnelilla. Kujalan eritasoliittymässä tehdään töitä erikoiskuljetusten reitin käyttöönottoa varten ja valtatiellä 4 on jatkettu louhintaa.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Louhintoja valtatie 4 varrella – kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä enintään 8 min pysäytyksiä
- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä siltojen paalutustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Launeella pohjavesisuojaustyöt ja bentoniittimattojen asennus
- Liipolan tunnelin rakennustyöt välitunnelilla ja läntisellä suuaukolla
- Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt

Nostavantien ylittävä
Luhdanjoen silta valettu.



VIIKON ONNISTUMISET:
Hankeosan pisin
silta valettu.

VIIKON ONNISTUMISET:
Helsingintien
kiertotie käyttöön!

Helsingintien kiertotie avaamisen jälkeen.



HANKEOSA 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Viikon aikana on jatkettu viimeistely- ja korjaustöitä. Kävelyn ja pyöräilyn väylien päällystyksiä jatkettiin tälläkin viikolla. Venetsian pikavuoropysäkillä johtavan vanha kävelyn ja pyöräilyn väylän rakennetta on parannettu vaihtamalla kerrosrakenteet. Kiveystyöt ovat jatkuneet useassa kohtaa. Renkomäessä joudutaan korjaamaan Hankaankadun risteyssillan vesieristystä, mistä johtuen tehdään kaistajärjestelyjä ennen ABC:n risteystä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Launeen risteyssillan ylittävä kävelyn ja pyöräilyn väylä suljettu, kiertotie Ajokadun kautta.
- Bussipysäkkien viimeistelyä
- Hankaankadun risteyssillan vesieristeen korjaus
- Päällystystöitä
- Kiveystöitä
- Alikulkukäytävien ja kävelyn ja pyöräilyn väylien viimeistelyitä
- Siivoustöitä

Uudenmaankatu Launeen eritasoliittymästä etelään.

VIIKON ONNISTUMISET:

Viimeistelyt etenevät.

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
