


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3:

1. Kehätien maaleikkaukset ja louherakenteet valmiit Hollolan pään hankeosuudella
2. Patomäessä rengasleiketäytöt etenevät hienosti
3. Ensi viikolla tiedossa joululahja Lotilaan

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus

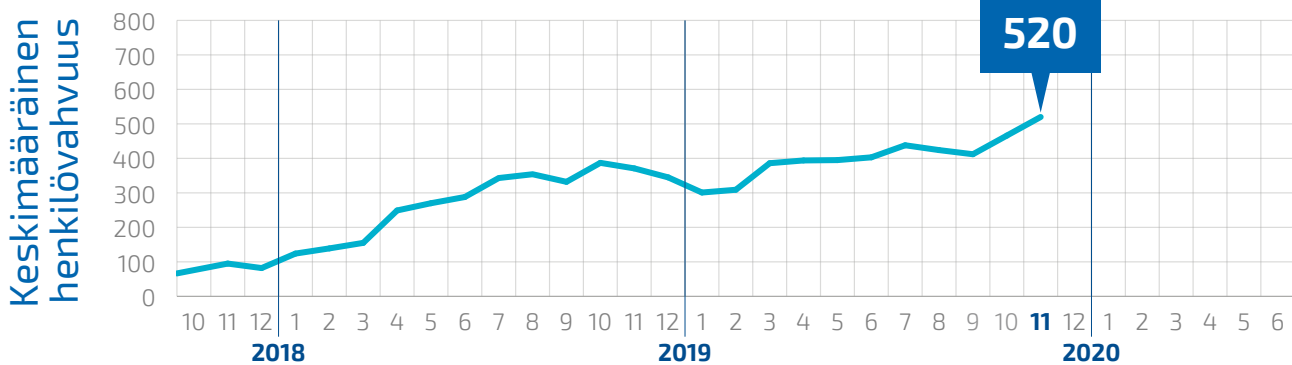

Turvallisuus

Tapaturmataajuus, marraskuu: 3,6*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4.

53

tapaturmatonta päivää

(ennätys: 660 päivää)

kehätien rakentaminen alkaa

ensimmäiset metrit liikenteelle Soramäessä

vuoden lopussa Vt 12 liikenteelle

viimeinen päällystekerros

2018 kevät

2019

kesä

2020



2021 viimeistelytöitä

2023

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka



Tilannekatsaus

Soramäen ja Takamaan välisellä osuudella työt ovat rauhoittuneet. Takamaan-kalliolla on kallion lujitustyöt käynnissä. Tikkakalliontien risteys sillan kannen muottityöt jatkuvat. Patiokallion risteys sillan telin pohjien teot ovat käynnistyneet. Lintulantien risteys sillan kohdalla ollutta louhepenkkaa on purettu, jotta ensi viikolla sillan paalutustyöt saadaan käyntiin. Okeroisissa ovat jatkuneet louherakenne- ja maaleikkaustyöt, jotka on nyt saatu valmiiksi. Lisäksi vanhaa Ala-Okeroistentietä on purettu. Porvoonjoen silloilla on käynnissä siirtymälaattojen rakennustyöt.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Tikkakalliontien risteys sillan kannen muottityöt jatkuvat
- Patiokallion risteys sillan telin pohjien teko jatkuu
- Useilla hankeosan silloilla syöksytöiden asennustöitä
- Lintulantien risteys sillan paalutukset alkavat
- Porvoonjoen sillalla siirtymälaatan valu
- Vanhan Ala-Okeroistentien purkutöitä
- Okeroisissa valaistus- ja telematiikkatöitä




Vt 12 osuudelta maaleikkaukset ja louherakenteet valmiit.

VIIKON ONNISTUMISET:

Vt 12 osuudelta maaleikkaukset ja louherakenteet valmiit.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

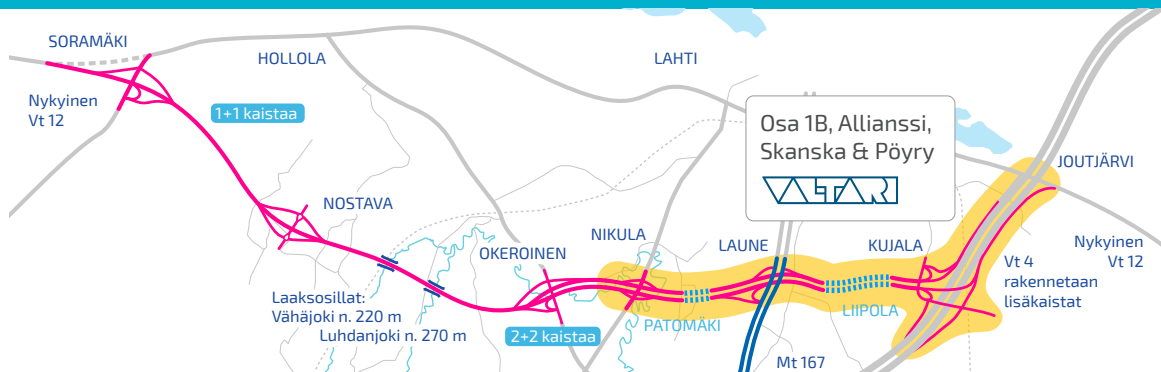

Tilannekatsaus

Kujalan eritasoliittymässä ahkeroidaan Lotilan teollisuusalueen liittymän käyttöön ottoa varten. Viikon aikana on tehty asfaltointeja, tiemerkeitä, luiskien muotoilua sekä kaiteiden ja opasteiden asennustöitä. Nikulan eritasoliittymässä ovat jatkuneet siltojen rakennustyöt. Kukonkosken sillalla on tehty muottia ja raudoituksia ja Nikulan ramppisillalla muotin purkua. Patomäen tunnelin seinien ulkopuolisten rengasleiketäyttöjen teko on onnistunut hyvin. Lisäksi tunnelilla on rakennettu otsapalkkeja ja asennettu palolevyjä. Launeella on rakennettu hulevesilinjaa ja tehty telematiikkatöitä. Liipolan tunnelilla ovat jatkuneet betonitunnelien rakennustyöt, läntisessä kalliotunnelissa verhousrakenteen teko ja itäisessä kalliotunnelissa reunaelementtien asennus. Itäisellä suuaukolla on käynnissä raudoitustyöt. Valtatiellä 4 tehtiin viikon aikana portaalien asennuksia.


Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Lotilan liittymä käyttöön
- Valtatiellä 4 liikenteen pysäytyksiä yöaikaan liikenneportaalien nostotöiden vuoksi
- Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä Kujalan eritasoliittymässä
- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä siltojen rakennustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Liipolan tunnelin rakennustyöt
- Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt



Rengasleiketäyttöjen teko Patomäen tunnelilla.

VIIKON ONNISTUMISET:
Patomäen onnistuneet rengasleiketäytöt!

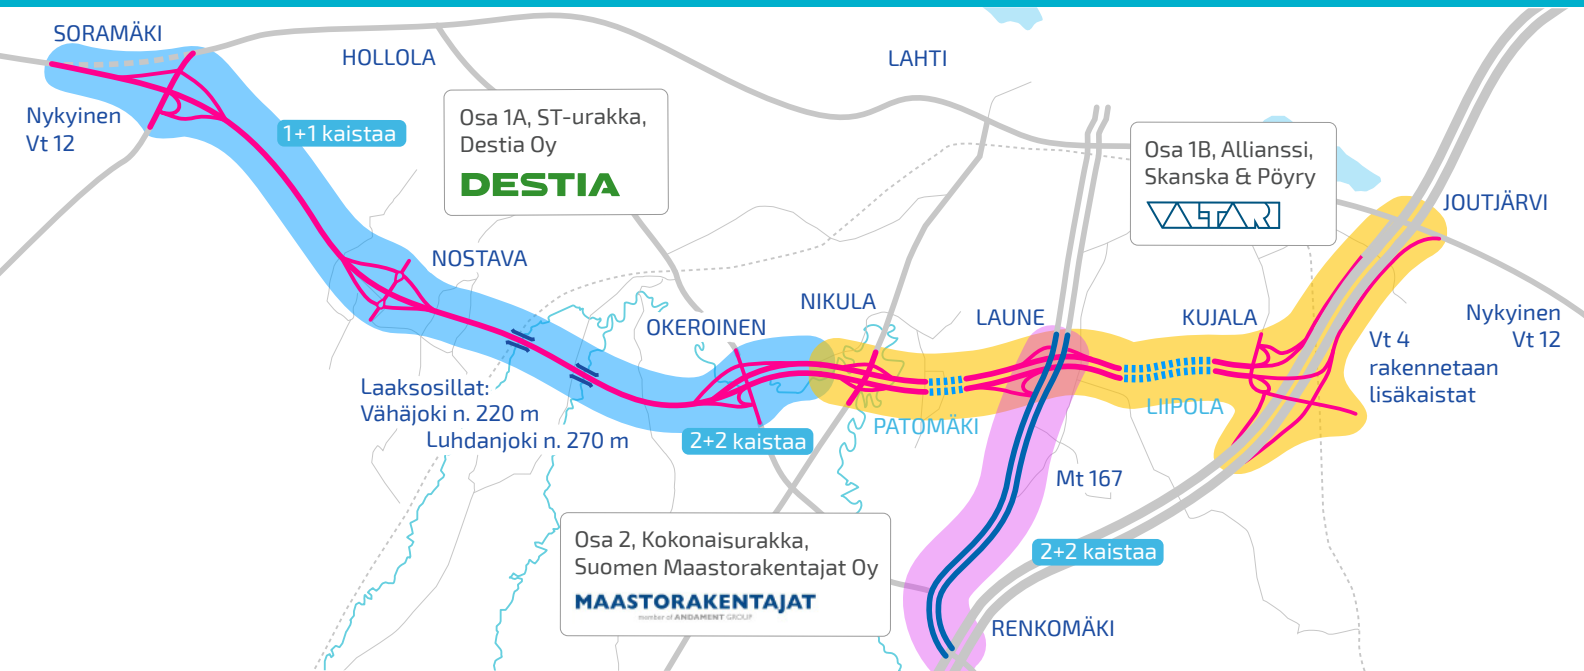

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström

Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen

Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



[facebook.com/vt12letke](https://www.facebook.com/vt12letke)



[@Vt12Letke](https://twitter.com/Vt12Letke)
