


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankkeen päätapahtumat

1. Hollolan päässä kehätien suuntainen kaapeliputkilinja valmistui
2. Yksi turvallisuushavainto viikon aikana -haaste käynnistyi Lahden päässä työmaata

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus

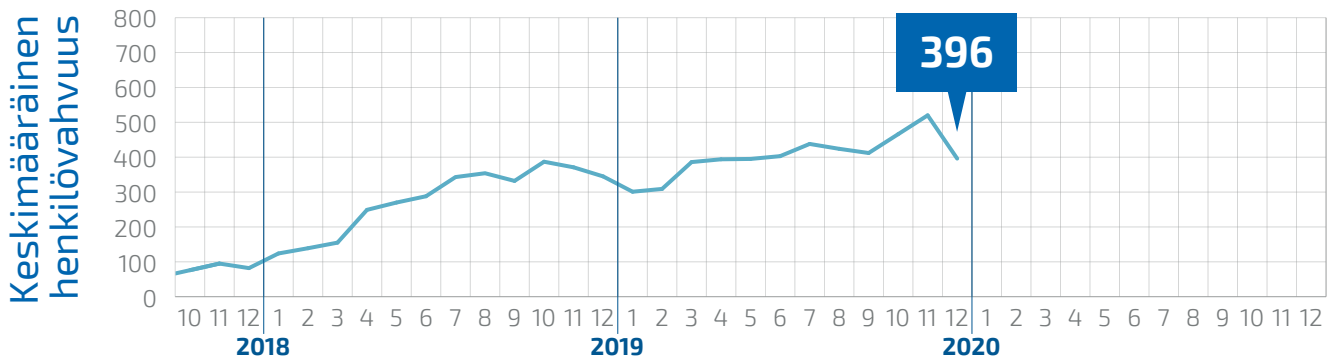

Turvallisuus

Tapaturmataajuus: 4,2*
(arvio 14.1.2020 tilanteessa)

10

tapaturmatonta päivää
(ennätys: 660 päivää)

Tapaturmataajuus päivitetään aina kuun vaihteen jälkeen. Viikolla 3 tapahtuneen tapaturman johdosta, esitämme arvion tammikuun tapaturmataajuudesta. Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4.

* tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.

kehätien
rakentaminen
alkaa

ensimmäiset
metrit liikenteelle
Soramäessä

vuoden lopussa
Vt 12 liikenteelle

viimeinen
päällystekerros

2018 kevät

2019

kesä

2020



2021
viimeistelytöitä

2023

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka



Tilannekatsaus

Patiokallion risteyssillan telinetyöt etenivät viikon aikana suunnitellusti. Myös Lintulantien risteyssillan paalutustyöt ovat jatkuneet ja ne saadaan valmiiksi helmikuun loppuun mennessä. Samaiseen Lintulantiehen liittyvän yksityistien rakentaminen on myös käynnissä. Lintulantiestä itään päin Okeroisissa ovat jatkuneet valaistuksen ja telematiikan putkityöt sekä kuivatuksen rakentaminen.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Soramäen ja Okeroisten eritasoliittymien alueilla liikennejärjestelyjä, kääntymiskaistat rakenteilla olevalle Valtatien 12 kehätielle on suljettu
- Lintulantiehen liittyvän yksityistien rakentaminen
- Patiokallion risteyssillan telinetyöt
- Lintulantien risteyssillalla paalutustyöt
- Okeroisissa valaistuksen ja telematiikan putkityöt




Kuvassa rakenteilla oleva Valtatie 12. Työmaan työt etenevät suunnitellusti.

VIIKON ONNISTUMISET:

Urakka-alueen kehätien suuntaiset kaapelisuoja-putket saatiin valmiiksi.

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

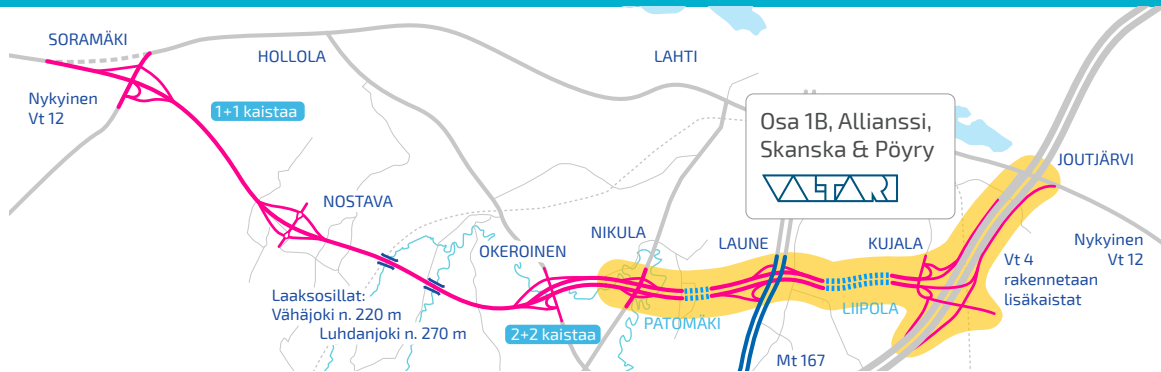

Tilannekatsaus

Tällä viikolla Nikulan eritasoliittymässä siltojen rakentaminen on jatkunut teline-, muotti- ja raudoitustöillä. Helsingintien kohdalla on poistettu asfalttia ja tehty maaleikkauksia. Patomäen tunnelilla on jatkettu otsapalkkien rakentamista, pohjavedensuojaustöitä ja telematiikan asentamista. Rakentaminen etenee myös Porvoonjoentien osalta maaleikkauksilla. Launeella on asennettu liikenteenohjauksen jalustoja, portaaleja sekä opasteita. Liipolan tunnelissa jatkuvat tekniikan asentaminen ja yhdyskäytävien rakentaminen. Välitunnelilla rakennetaan kallioliittymää ja kaulusrakennetta ja läntisellä suuaukolla on tehty viikon aikana seinien, holvien ja kauluksen valutöitä. Kujalan eritasoliittymässä on purettu työmaatietä, jatkettu maisemointitöitä ja tehty opastin- ja portaaliasennuksia.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt


- Kujalan eritasoliittymässä käytössä yhteys Lotilan teollisuusalueelle ja Pippoon sekä kevyen liikenteen yhteys valtatie 4 yli
- Helsingintien kiertotie käytössä
- Nikulan eritasoliittymässä silta- ja tienrakennustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Liipolan tunnelin rakennustyöt
- Telematiikan rakentaminen

Otsapalkit alkavat valmistua Patomäen tunnelilla.



VIIKON ONNISTUMISET:

Työmaakokouksen osallistujat ryhtyivät haasteeseen, jossa jokainen tekee yhden turvallisuus-havainnon seuraavan viikon aikana.

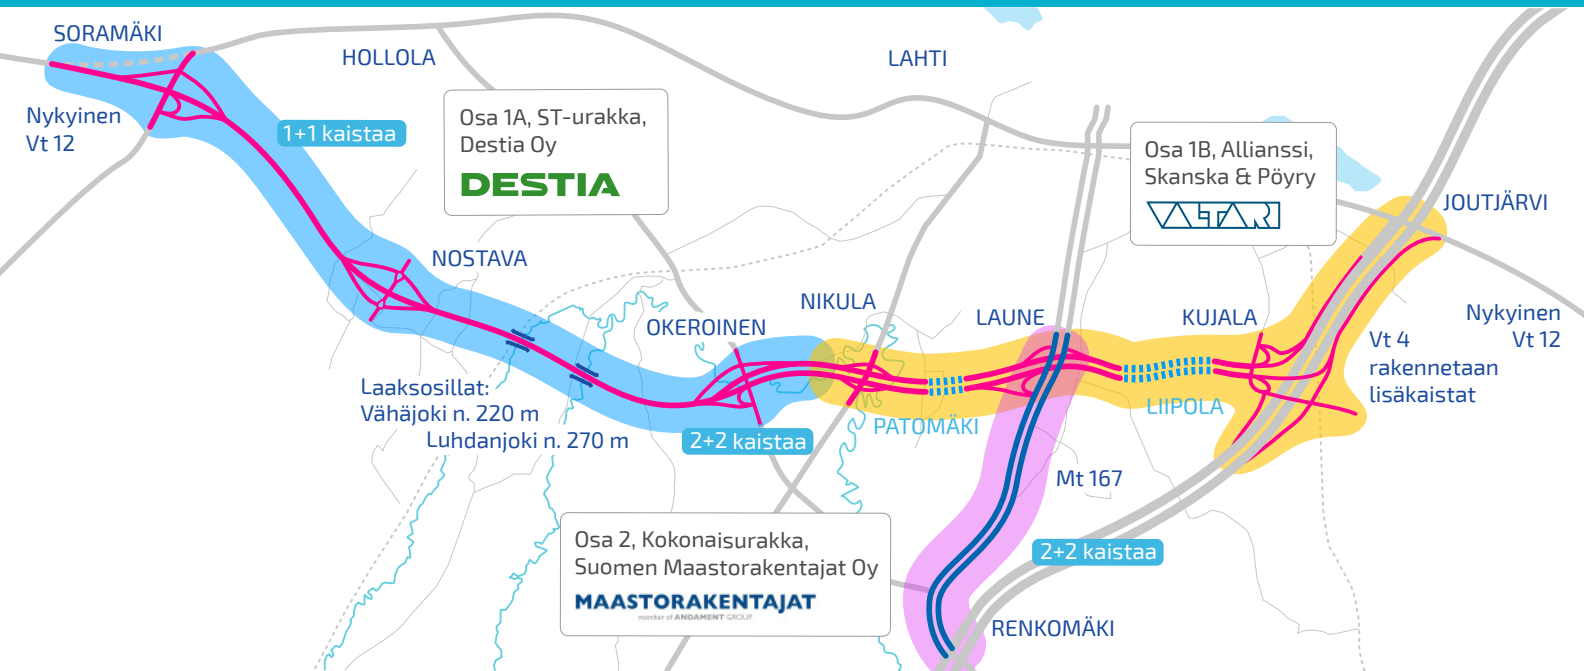

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström

Väylä
 puh. 029 534 3600
 janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen

Väylä
 puh. 029 534 3563
 juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



[facebook.com/vt12letke](https://www.facebook.com/vt12letke)



[@Vt12Letke](https://twitter.com/Vt12Letke)
