Viikkotiedote
nro 87 | vko 27 | 2019

VÄYLÄ LAHTI Hollola Lahden Seutu

Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3

1. Hollolan päässä kaikki paalulaatat valettu.
2. Orvokkitien reunakivien kiveystyöt saatiin valmiiksi.
3. Kesäsateet ovat huolehtineet työmaateiden pölynsidonnasta.

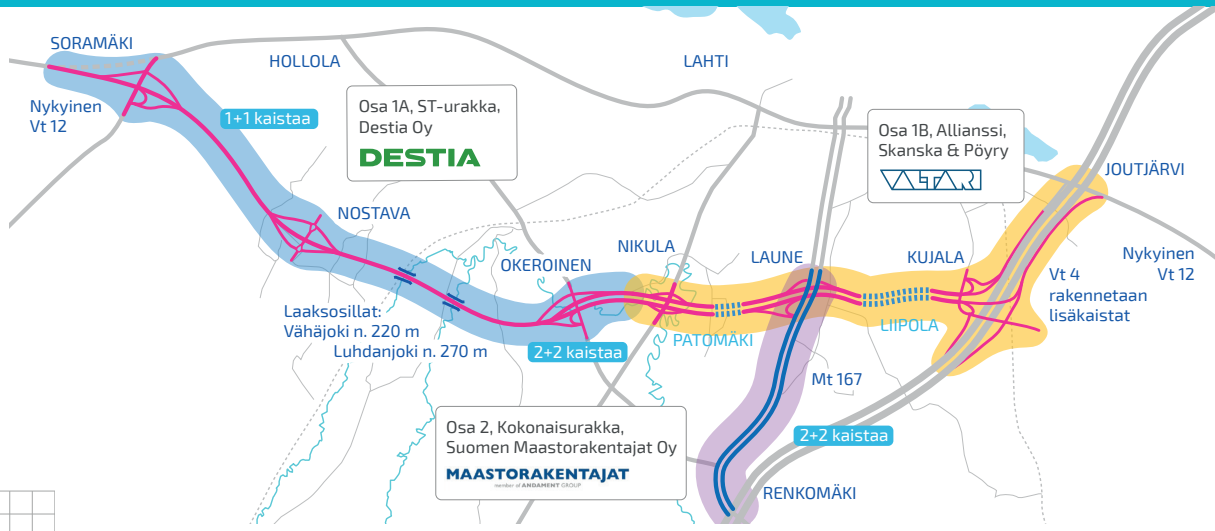

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, kesäkuu: 2,2*

Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

37 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.

kehätien rakentaminen alkaa

mt167 2+2 Vt 4–Aukeankatu välillä

mt167 valmis

2018 kevät — 2019 — kesä — 2020 — **vuoden lopussa Vt12 liikenteelle** — 2021 viimeistelytöitä — 2023 viimeinen päällystekerros

HANKEOSA 1A

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Soramäen uuden eritasoliittymän alueella päällystystyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Soramäen risteyssillalla on käynnissä liikuntasaumalaitteen asennustyöt sekä sillan pintarakennetyöt. Takamaalla silta- ja maanrakennustyöt jatkuvat, hankeosan viimeinen paalulaatta Takamaalla on saatu valettua. Vähäjoen sillalla tehdään kannen muotin purkutöitä sekä rakennetaan otsamuuria. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla ovat raudoitustyöt täydessä vauhdissa. Okeroisten risteyssillalla teline- ja muottityöt jatkuvat sekä sillan raudoitustyöt on saatu aloitettua. Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Soramäen kiertoliittymän ja Hollolan Matkakeitaan välisellä tieosuudella etelänpuoleinen ajorata suljettu, käytössä yksi ajokaista molempiin suuntiin
- Soramäen kiertoliittymästä Tampereen suuntaan alennettu nopeusrajoitus 50km/h ja kaistajärjestelyjä
- Kiertotiejärjestelyt Soramäessä ja Okeroisissa
- Soramäen risteyssillalla, Porvoonjoen sillalla ja Ala-Okeroisten sillalla kansien pintarakennetyöt käynnissä
- Louhintatyöt jatkuvat Takamaan, Hirvikallion ja Nostavan alueilla
- Okeroisten risteyssillalla kannen teline-, muotti- ja raudoitustyöt käynnissä
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella

Hankeosan paalulaatat on valettu (kuva Seppo Kujanen).

VIIKON ONNISTUMISET:

Hankeosan paalulaatat on valettu.

HANKEOSA 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla Nikulassa on jatkettu Kukonkosken sillan maatöitä. Ali-Juhakkalan sillan kansi on sinkopuhallettu vedeneristystöitä varten, jotka aloitetaan kahden viikon kuluttua. Sinkopuhallus on työmenetelmänä hiekkapuhalluksen kaltainen, jossa pinta puhdistetaan kovan paineilman ja kiinteiden hiukkasten avulla. Patomäessä tunnelin seinien ja holvien raudoitus, laudoitus ja valutyöt jatkuvat. Orvokkitien kiveystyöt on saatu reunakivien osalta valmiiksi. Liipolan kalliotunnelin yhdyskäytävät ovat työn alla ja läntisellä suuaukolla on valmistunut massanvaihto. Kujalassa murskaustyöt jatkuvat, valaistuksien kaapelointityöt ovat käynnissä ja risteyssillan teline- ja muottityöt jatkuvat. Pipon alikulkusillalle asennettiin laakerit. Laakereiden avulla siltakokonaisuus sopeutuu lämpölaajenemiseen.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Louhintoja valtatien 4 varrella – kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä enintään 8 min pysäytyksiä
- Orvokkitien kevytliikenne siirretään Sokeritopankadulle seuraavan 2 viikon ajaksi
- Orvokkitien luiskien muotoilu alkaa
- Ajokadun kiveystyöt jatkuvat
- Eteläisen rengastien ja Porvoonjoentien muutostyöt jatkuvat
- Kujalassa jatkuvat murskaustyöt ja eritasoliittymän rakentaminen
- Betonitunneleiden rakennustyöt
- Launeen pohjavesisuojauskaukalon betonirakennetyöt
- Ajokadun sillan reunakehyksien teko jatkuu

VIIKON ONNISTUMISET:

Patomäen tunnelin holvivalut ovat lähteneet hyvin käyntiin.

Patomäen betonitunnelin kannen valu.

HANKEOSA 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Uudenmaankadulla viimeistelytyöt jatkuvat. Risteysalueiden päällystykset siirtyivät ensi viikolle runsaiden sateiden vuoksi. Sateet aiheuttivat alkuviikosta pienimuotoisia tulvia myös työmaa-alueella. Liikennevalojen asennustyöt ovat jatkuneet Aukeankadun risteyksessä. Kiveystöitä on jatkettu alikuluissa, ja istutukset ovat täydentyneet pensailla. Hulevesipumppaamoihin liittyvät viimeistelyt jatkuvat. Hankaankadulle tehdään uusi liittymä autoliikkeille, mistä johtuen tontille ajoon tulee muutoksia.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Aukeankadun risteyksessä liikennevalojen testaus ja käyttöönotto
- Liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Launeen risteyssillan ylittävä kävelyn ja pyöräilyn väylä suljettu, kiertotie Ajokadun kautta.
- Hankaankadulla autoliikkeiden uuden liittymän teko
- Päällystystöitä risteysalueilla
- Vihertyöt
- Hulevesipumppaamojen ja -linjojen viimeistelyt
- Alikulkukäytävien ja kävelyn ja pyöräilyn väylien viimeistelytöitä
- Valaistuksen asennusta
- Bussipysäkkien viimeistelyä

Launeen risteyssillan kävelyn ja pyöräilyn väylää.

VIIKON ONNISTUMISET:

Vihertyöt ovat edenneet suunnitellusti.

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke
facebook.com/vt12letke
twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
