VÄYLÄ LAHTI Hollola Lahden Seutu

Viikkotiedote
nro 104 | vko 44 | 2019

Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3:

1. Ala-Okeroistentie siirtyy uudelle linjaukselle maanantaina 4.11.
2. Valtatiellä 4 Kujalassa 4,4 metrin korkeusrajoitukset on purettu.
3. Patomäen tunnelin holvi on valettu kokonaisuudessaan.

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus

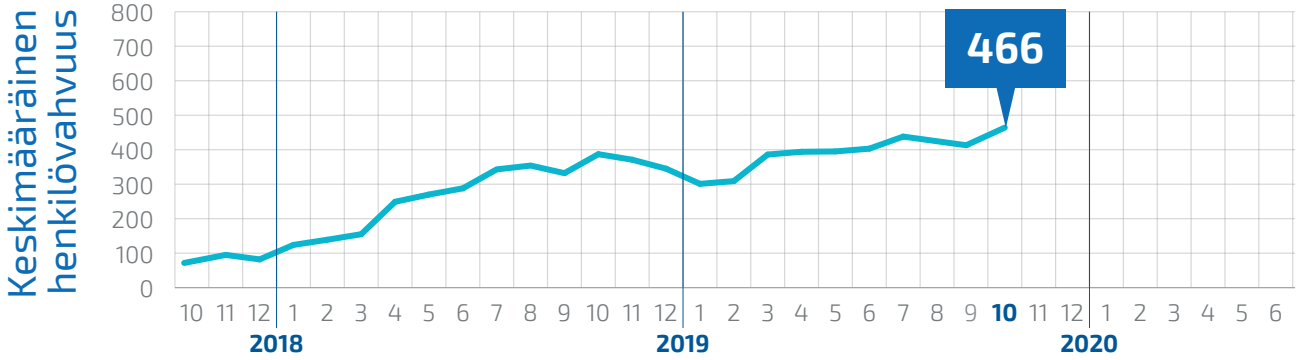

Turvallisuus

Tapaturmataajuus, syyskuu: 4,1*

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden. Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013-2017 on 10,4.

11

tapaturmatonta päivää

(ennätys: 660 päivää)

kehätien rakentaminen alkaa — 2018 kevät

2019

ensimmäiset metrit liikenteelle Soramäessä — kesä

2020

vuoden lopussa Vt 12 liikenteelle

2021 viimeistelytöitä

viimeinen päällystekerros — 2023

HANKEOSA 1A

Urakoitsija: Destia Oy

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

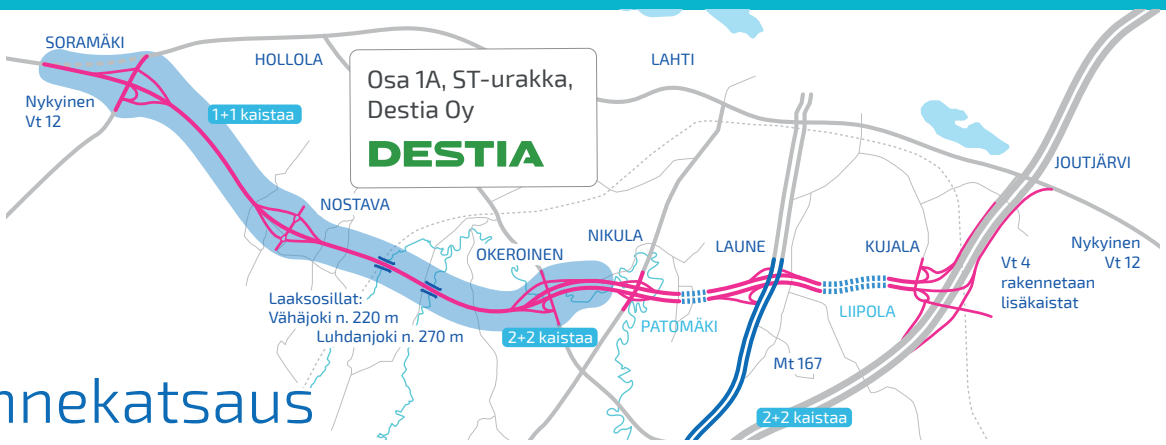

Tilannekatsaus

Soramäessä Riihimäentien läheisyydessä on jatkunut kävelyn ja pyöräilyn väylän sekä yksityistien rakentaminen. Riista-aidan asennustyöt ovat käynnissä Tikkakalliolla ja Patiokalliolla. Kaidetöitä tehdään koko tielinjalla. Luhdanjoen sillalla kannen eristystyöt ovat käynnissä. Tikkakalliontien risteyssillan kannen telinetyöt ovat jatkuneet. Ensi viikolla ajoneuvoliikenteen käyttöön otettavalla Ala-Okeroistentiellä viimeistelytyöt ovat olleet täydessä vauhdissa, tietä on mm. päällystetty ja ajoratamerkinnät tehty. Myös Okeroisten risteyssiltaa on viimeistelty, jotta ensi viikolla yleinen liikenne pääsee kulkemaan sujuvasti sillan yli. Koko hankealueella on alettu valmistutumaan talven tuloon, työmaata on mm. siivottu ja varastoalueita laitettu kuntoon.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Soramäessä Riihimäentien vierellä käynnissä kävelyn ja pyöräilyn väylän sekä yksityistien rakentaminen, töistä johtuen Riihimäentiellä kaistajärjestelyjä
- Ala-Okeroistentiellä liikennejärjestelyt muuttuvat, Ala-Okeroistentien ajoneuvoliikenne siirretään kulkemaan uuden kiertoliittymän ja Okeroisten risteyssillan kautta ma 4.11.
- Rälssinkatu suljetaan 4.-25.11.2019 väliseksi ajaksi, tonteille ajo sallittu Kyläkunnantien kautta
- Riista-aidan asennustyöt Tikkakalliolla ja Patiokalliolla
- Ala-Okeroistentien läheisyydessä uuden kävelyn ja pyöräilyn väylän rakentaminen jatkuu
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennustyöt ovat käynnissä koko hankealueella

Ala-Okeroistentien liikenne siirretään uudelle väylälle 4.11.2019.

VIIKON ONNISTUMISET:

Ala-Okeroistentie päällystetty ja maalimerkinnät tehty.

HANKEOSA 1B Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

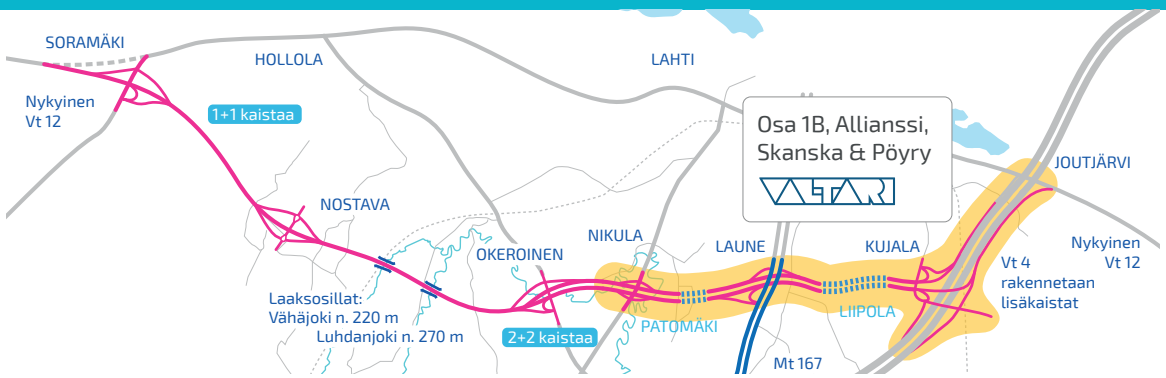

Tilannekatsaus

Tällä viikolla on jatkettu Kukonkosken sillan paalujen katkaisua ja tehty pilareiden muotteja. Nikulan ramppisillalla on tehty teline- ja muottitöitä sekä kannen raudoitusta ja Nikulan risteyssillalla pilareiden valua. Patomäessä käynnissä ovat olleet pohjaveden suojaustyöt, salaojien rakentaminen ja seinien ulkopuolisten täyttöjen tekeminen. Patomäen tunnelissa viimeiset holvivalut on saatu tehtyä. Launeella on rakennettu kantavia kerroksia tielinjalle ja rampeille ja asfaltoitu eteläistä ajorataa. Betonitunneleiden rakentaminen jatkuu Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla ja välitunnelin kohdalla ja kalliotunnelissa jatkuu verhousrakenteen teko. Kujalassa on jatkunut Kujalan risteyssillan muotin purku sekä kiveyksien ja luiskien teko. Asfaltointi on ollut käynnissä valtatiellä 4.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Erikoiskuljetusten kiertoreitti käytössä Kujalan eritasoliittymässä
- Uudet liikennejärjestelyt voimassa valtatien 4 Kujalan eritasoliittymän kohdalla öisin siltatöiden ja asfaltoinnin vuoksi
- Helsingintien kiertotie käytössä
- Ponttiseinien purkutyöt Patomäessä
- Nikulan eritasoliittymässä siltojen rakennustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Liipolan tunnelin rakennustyöt
- Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt

Patomäen holvin valu valmistuu.

VIIKON ONNISTUMISET:

Patomäen holvivalut suoritettu.

HANKEOSA 2

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

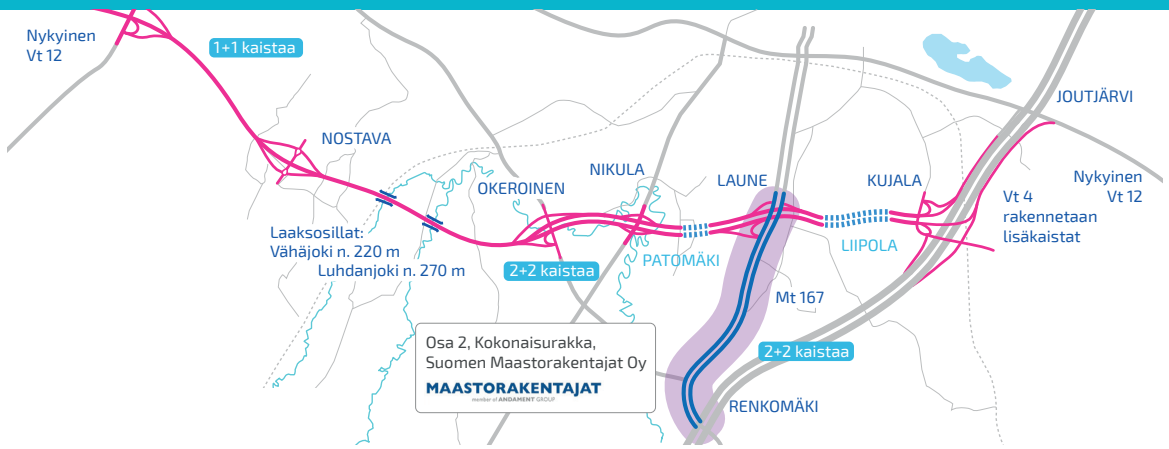

Tilannekatsaus

Tällä viikolla saatiin Simolanmutka ja Ajokatu päällystettyä. Hulevesityöt saatiin valmiiksi Aukeankadun alikulkukäytävän luona. Jalankulun ja pyöräilyn väylillä päällystettiin mm. Aukeankadun kohdalla sekä Launeen risteyssillan luona. Ensi viikolla on tarkoitus saada kaikki jalankulun ja pyöräilyn väylät avattua.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kohdekohtaisia liikennejärjestelyjä risteysalueilla liikennevalojen kuituyhteyden asentamisen vuoksi
- Simolanmutkan tiemerkintätyöt (säävaraus)
- Siivousta koko urakka-alueella

Jalankulun ja pyöräilyn väylä Aukeankadun alikulun kohdalla.

VIIKON ONNISTUMISET:

Päällystykset saatiin tehtyä Ajokadulla ja Simolanmutkassa.

LYHYESTI

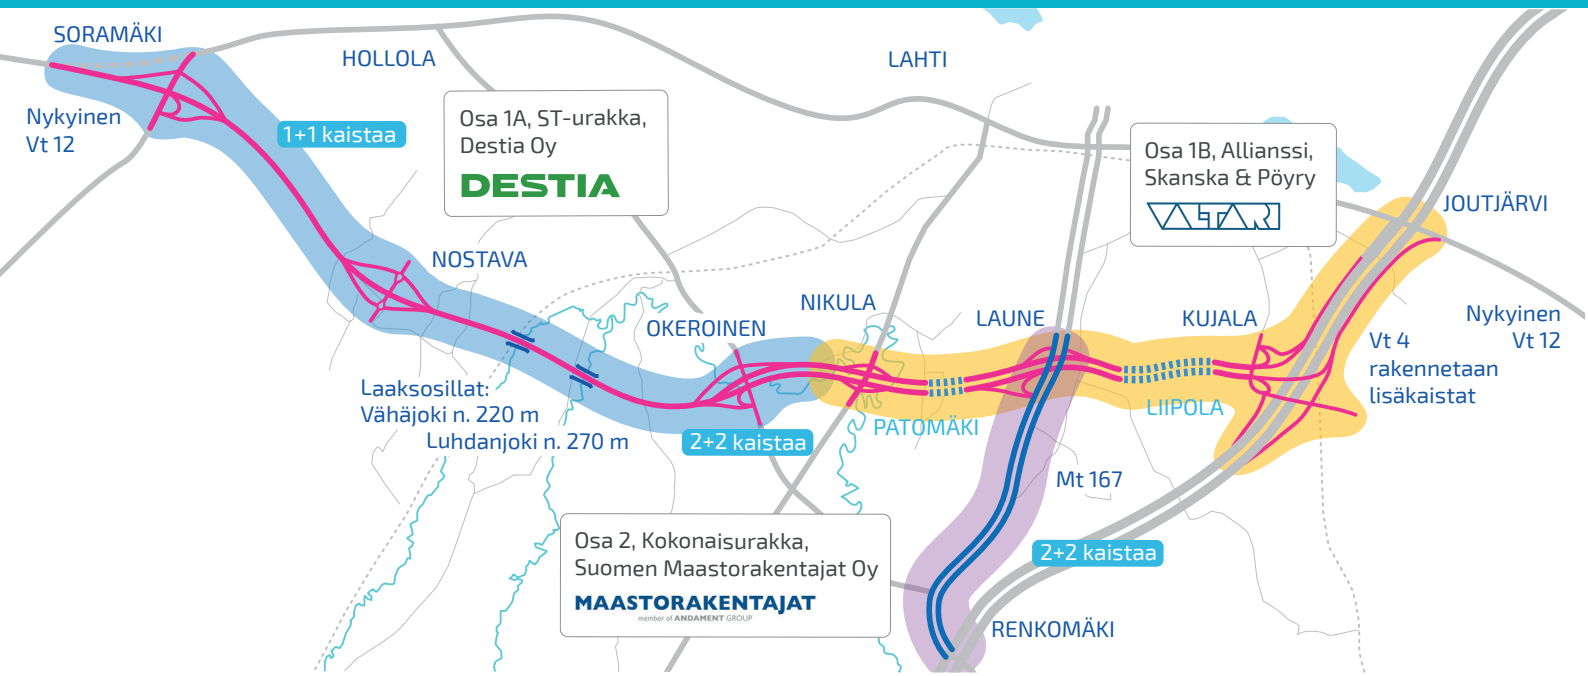

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatien 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke

facebook.com/vt12letke

twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
