



# Vt12 Lahden eteläinen kehätie

## Hankekokonaisuus Top 3

1. Okeroisissa paalutus on sujunut reippaasti
2. Patomäen kaivannon tuentatyöt ovat alkaneet suunnitellusti ja sujuneet ongelmitta
3. Työt etenevät koko hankealueella helteisessä säässä

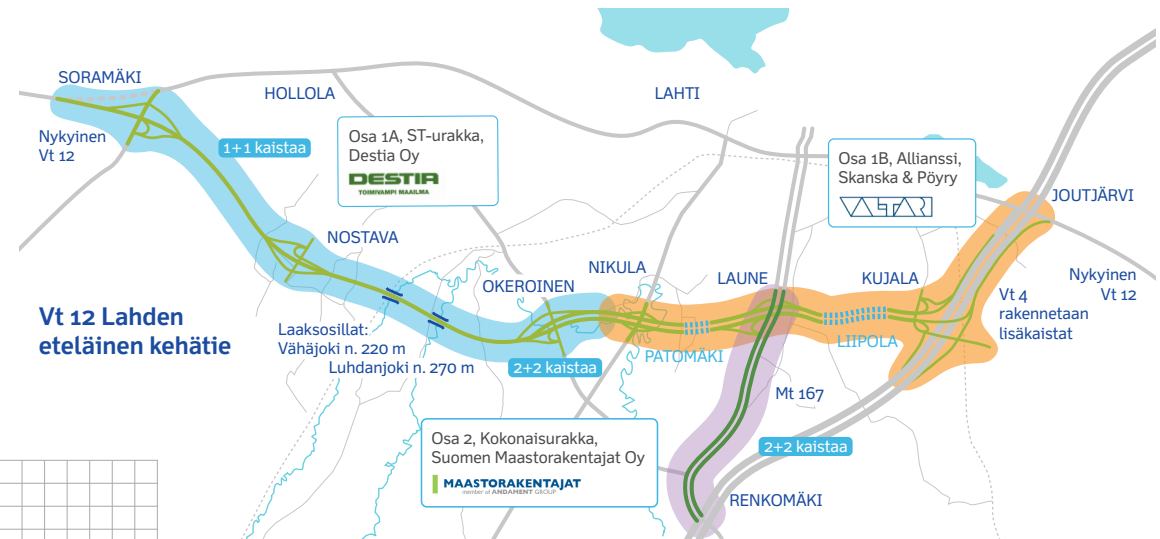

## Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



## Turvallisuus

Tapaturmataajuus 0, rakentamisen alusta 449 tapaturmatonta päivää.



## Hankeosa 1A

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

### Tilannekatsaus

Tällä viikolla tehtiin töitä Soramäessä Pässinportin ja Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla – käynnissä ovat kannen eristystyöt. Maaleikkauksia, louhintoja sekä louhepenkereitä tehtiin Soramäessä, Tikkakalliontien ja Patiokallion alueilla sekä Okeroisissa. Patiokalliolla rakennettiin lisäksi tulevan Vähäjoen sillan pilareiden anturoita. Okeroisissa otettiin käyttöön kiertotiejärjestelyt, jotta esimerkiksi paalutus onnistuisi vanhan Ala-Okeroistentien kohdalla. Alueella paalutettiin tällä viikolla kahden paalutuskoneen voimin.

### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Siltojen korjaukseen liittyvät liikennejärjestelyt Soramäessä Pässinportin ja Ahertajantien risteyssiltojen kohdalla
- Murskaustyöt alkavat Soramäen alueella
- Louhintoihin liittyviä liikenteen pysäytyksiä ruuhka-aikojen ulkopuolella Soramäessä ja Nostavantiellä
- Louhintatyöt, maaleikkaukset ja penkereiden teko jatkuvat Soramäessä, Tikkakalliontien ja Nostavantien läheisyydessä sekä Patiokallion ympäristössä
- Patiokalliolla Vähäjoen ylikulkusillan perustusten tekeminen jatkuu

### Viikon onnistumiset

- Kiertotien käyttöönotto sujui erittäin jouhevasti Okeroisissa!



Kuvassa Vähäjoen ylikulkusillan anturan porapaalujen valu.

## Hankeosa 1B

Vt12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti

Allianssi, VALTARI (Skanska Infra & Pöyry Finland Oy)

### Tilannekatsaus

Tällä viikolla Luhdantaustankatu ja Apilakatu suljettiin ajoneuvoliikenteeltä ja liikenne siirrettiin korvaaville reiteille. Samoin jalankulun ja pyöräilyn väylien kiertoreitit otettiin käyttöön kummankin kadun osalta. Orvokkitien työt jatkuivat tohinalla, jotta tie saadaan avattua ennen koulujen alkua. Ajokadun risteyssillan anturapalkit valmistuivat, ja ensi viikolla päästään aloittamaan itse anturoiden valuja.

### Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Patomäen kaivannon tuentatyöt jatkuvat
- Patomäen johto- ja maakaasunsiirtotyöt jatkuvat
- Orvokkitien kantavan kerroksen tekeminen alkaa
- Ajokadun risteyssillan perustusten teko jatkuu
- Ajokadun ja Uudenmaankadun välisen väylän maaleikkaustyöt
- Orvokkitien ja Sokeritopankadun välisen jalankulun ja pyöräilyn väylän rakentaminen
- Liipolan välitunnelin kaivuutyöt alkavat
- Vt 4 louhinnat alkavat Hartwallin kohdalla
- Vt 4 liikennejärjestelyjen rakentaminen

### Viikon onnistumiset

- Työmaatoimistolle saatiin vihdoinkin ilmastointi!



Pontitustyöt käynnistyivät Patomäessä alkuvuikosta.

## Hankeosa 2

### Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

## Tilannekatsaus

Tällä viikolla keskityttiin uusien jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien rakentamiseen, ja asfalttipinta ulottuu nyt Aukeankadulta Orimattilankadulle saakka. Myös Launeella valmisteltiin uutta jalankulun ja pyöräilyn väylää. Muualla työmaa-alueella tehtiin uusien alikulkukäytävien kaivu- ja täyttötöitä sekä vesieristystöitä. Kyöstilän alikulkukäytävän luona aloitettiin lisäksi paalutustyöt.

## Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Kyöstilän alikulkukäytävän paalutustyöt
- Kangasmäen alikulkukäytävän kehän valu
- Orimattilankadun alikulkukäytävän kaiteiden asennus
- Aukeankadun alikulkukäytävän kaivutöitä ja paalutus
- Nikkilän alikulkukäytävän muotin purku
- Launeen alikulkukäytävän täyttötöyt ja siirtymälaattojen rakentaminen
- Launeen risteysillan vesieristystöitä ja penkereiden täytöt
- Patomäen alikulkukäytävä täyttötöyt ja vaahtolasikevennys
- Uusien jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien rakentaminen

## Viikon onnistumiset

- Uusi jalankulun ja pyöräilyn yhteys Aukeankadulta Orimattilankadulle saatiin asfaltoitua.



Uusi jalankulun ja pyöräilyn yhteys alkaa hahmottua Launeella.

## Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

### Lisätiedot

Projektijohtaja Janne Wikström  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3600  
janne.wikstrom@liikennevirasto.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen,  
Liikennevirasto  
puh. 029 534 3563  
juha-pekka.hamalainen@liikennevirasto.fi

### Seuraa hanketta

liikennevirasto.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
