
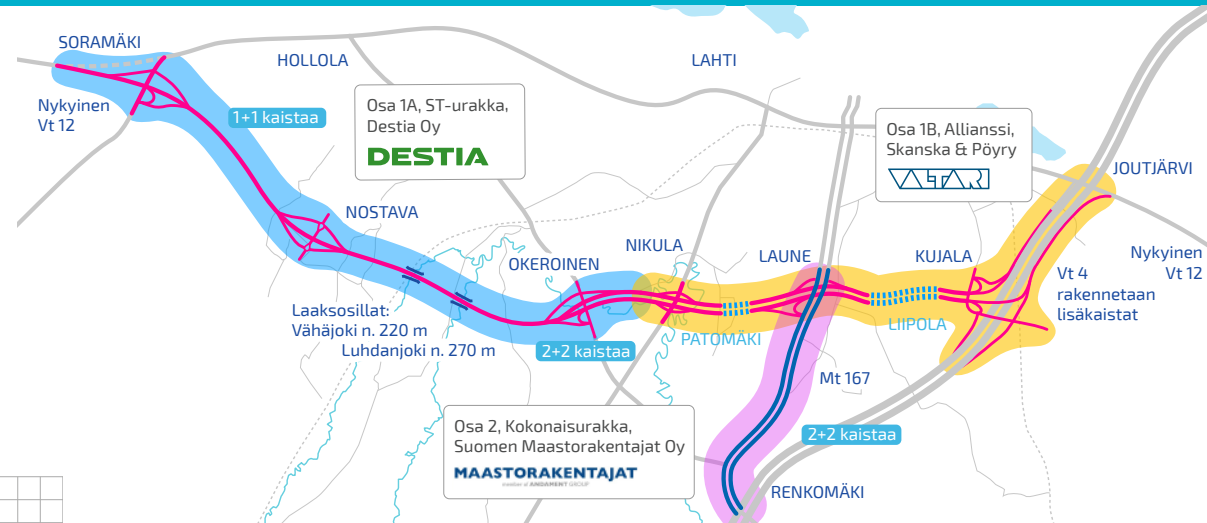


Vt 12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE

Hankekokonaisuus Top 3:

1. Soramäessä avattiin kehätien ensimmäiset metrit liikenteelle.
2. Helsingintien kiertotien käyttöönotto ensi viikolla.
3. Okeroisissa kaikki sillat nyt valettu.

Hankekokonaisuuden henkilövahvuus



Turvallisuus

Tapaturmataajuus, heinäkuu: 3,0*

Väylän kaikkien väylähankkeiden tapaturmataajuuden keskiarvo vuosilta 2013–2017 on 10,4.

23 tapaturmatonta päivää (ennätys: 660 päivää)

* Tapaturmataajuuteen (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohden) lasketaan vain työtapaturmat, jotka ovat aiheuttaneet vähintään yhden päivän työkyvyttömyyden.



HANKEOSA 1A

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Hollola, ST-urakka

Urakoitsija: Destia Oy

Tilannekatsaus

Yksi hankeosan tavoite on saavutettu suunnitellussa aikataulussa, kun Soramäen eritasoliittymän alue otettiin liikenteelle 15-16.8. välisenä yönä. Eritasoliittymästä itään päin kulkevat rampit tosin ovat vielä suljettuna. Hirvikallion ja Takamaan alueella silta- ja maarakennustyöt etenevät hyvällä tahdilla eteenpäin, murskaustyöt aloitettiin tällä viikolla Takamaalla. Vähäjoen sillalla muotin purkutyöt sekä liikuntasauimalaitteen asennustyöt ovat käynnissä. Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla raudoituksia viimeistellään sekä kannen varustelutyöt ovat käynnissä, sillalla valmistaudutaan kannen valuun. Betonimäärältään hankeosan suurin silta, Okeroisten risteysilta, saatiin onnistuneesti valettua. Tästä on hyvä jatkaa ensi viikkoa kohden!

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Soramäen eritasoliittymän alueella kaistajärjestelyjä
- Kiertotiejärjestelyt Okeroisissa
- Louhintatyöt jatkuvat Patiokallion, Takamaan ja Hirvikallion alueilla
- Murskaustyöt käynnissä Takamaalla
- Hirviaidan asennusta Soramäki-Takamaan alue
- Nostavantien ylittävällä Luhdanjoen sillalla kannen valu
- Valaistus-, telematiikka- ja maanrakennus-työt ovat käynnissä koko hankealueella

HANKEOSA 1B

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie, Lahti, Allianssi

Urakoitsija: VALTARI (Skanska Infra Oy & Pöyry Finland Oy)

Tilannekatsaus

Tällä viikolla alkoi koulutyö Launeen koulussa ja rakennustyöt koulun ympäristössä saatiin valmiiksi turvallista koulun aloitusta varten. Nikulan eritasoliittymässä jatkettiin Helsingintien kiertotien viimeistelyä ja loppuviikosta aloitettiin sekä kävely- ja pyöräily-yhteyden että ajoneuvoliikenteen kiertotien asfaltointi. Helsingintien kiertotie on määrä ottaa käyttöön ensi viikon aikana. Kukonkosken tulevalle sillalle saapui paalutuskone ja paalutus päästään aloittamaan. Patomäen tunnelin rakennustyöt ovat jatkuneet seinien ja holvien rakentamisella ja Launeella on jatkettu pohjavesisuojaus- ja rakentamista. Liipolan tunnelin läntisellä suuaukolla on rakennettu anturoita ja välitunnelilla anturapohjia sekä seiniä ja holveja. Kujalan eritasoliittymässä on jatkettu maatotit sekä siltojen rakennustöitä. Valtatiellä 4 louhinnat ovat olleet käynnissä.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Louhintoja valtatie 4 varrella – kiertotie käytössä, louhintoihin liittyviä enintään 8 min pysäytyksiä
- Helsingintien kiertotien viimeistely ja liikenteelle otto
- Nikulan eritasoliittymässä siltojen paalutustyöt
- Patomäen tunnelin rakennustyöt
- Launeella pohjavesisuojaustyöt ja bentoniittimattojen asennus
- Liipolan tunnelin rakennustyöt välitunnelilla ja läntisellä suuaukolla
- Kujalan eritasoliittymän rakennustyöt

Soramäen eritasoliittymä avattu yleisen liikenteen käyttöön.

VIIKON ONNISTUMISET:
Soramäen eritasoliittymä liikenteellä.

VIIKON ONNISTUMISET:
Koulutyö saatu turvallisesti käyntiin Launeen koulussa.

Kujalan eritasoliittymässä etenevät maatyöt ja siltojen rakentaminen.

HANKEOSA 2

Mt 167 Lahden eteläinen sisääntulotie, KU

Urakoitsija: Suomen Maastorakentajat Oy

Tilannekatsaus

Viikon aikana on jatkettu viimeistelyitä. Päälystäjät kävivät jälleen työmaalla, pääpaino oli kävelyn ja pyöräilyn väylien päälystyksissä. Uudenmaankadun urakassa kävelyn ja pyöräilyn väylien asfaltissa käytetään kierrätetystä kattohuovasta valmistettua kattohuopabitumia. Orimattilankadulla on viikon mittaan parannettu katurakennetta tekemällä massanvaihtoa. Työ saadaan päätökseen tulevalla viikolla.

Tulevan viikon työt ja liikennejärjestelyt

- Liikennettä haittaavia kaistojen sulkemisia ja liikenteen pysäyttämisiä pääosin ruuhka-aikojen ulkopuolella
- Launeen risteyssillan ylittävä kävelyn ja pyöräilyn väylä suljettu, kiertotie Ajokadun kautta.
- Hankaankadulla päälystystöitä
- Kiveyksen rakentamista
- Alikulkukäytävien ja kävelyn ja pyöräilyn väylien viimeistelyitä
- Bussipysäkkien viimeistelyä
- Siivoustöitä

Uusi kävelyn ja pyöräilyn väylällä asfaltoituna.

VIIKON ONNISTUMISET:
Kävelyn ja pyöräilyn väylät saivat mustaa pintaan.

LYHYESTI

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hanke

Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittämismahdollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen. Työt maantiellä 167 alkoivat keväällä 2017 ja valtatie 12 osalta ne käynnistyivät keväällä 2018.

Lisätiedot

Projektipäällikkö Janne Wikström (lomalla vkot 31-33)
Väylä
puh. 029 534 3600
janne.wikstrom@vayla.fi

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen
Väylä
puh. 029 534 3563
juha-pekka.hamalainen@vayla.fi

Seuraa hanketta

vayla.fi/vt12letke



facebook.com/vt12letke



twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)
