


Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie, STk-urakka

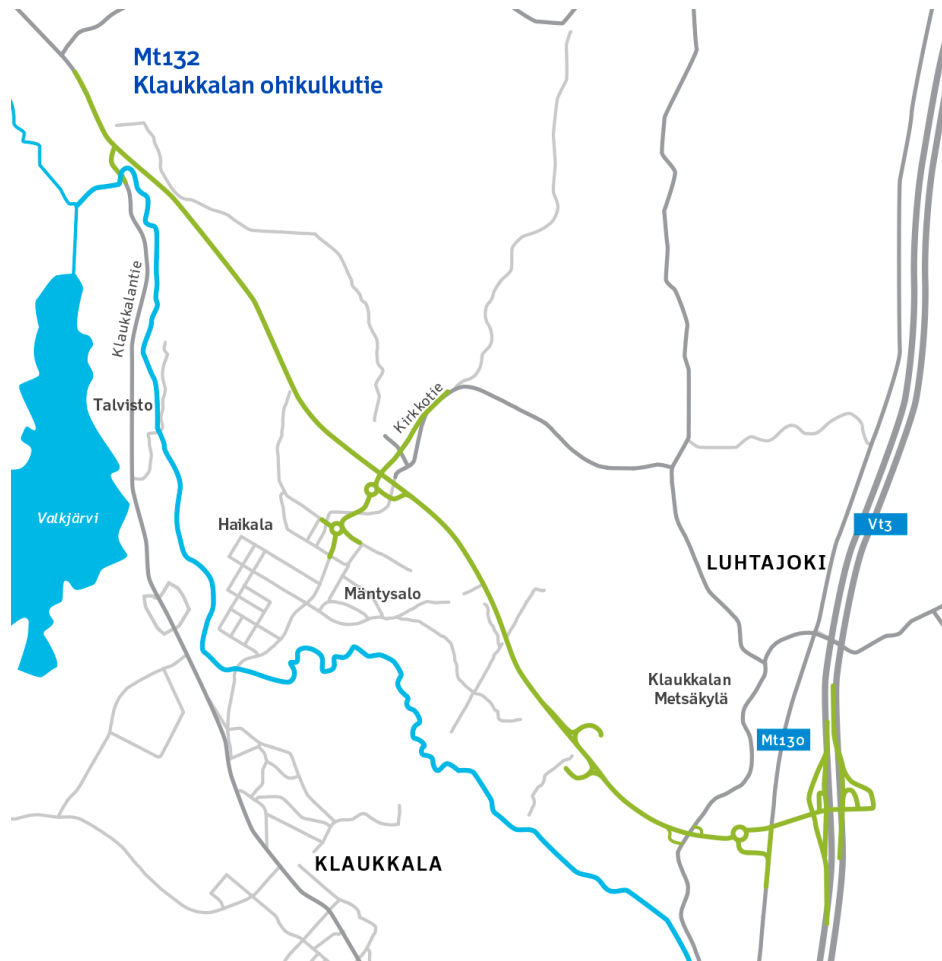

Kuukausiraportti nro 6/2018
Tarkastelujakso: 1.10.2018 - 31.10.2018

Laatinut: Rakennuttajatoimisto HTJ Oy
Hyväksynyt: Liikennevirasto

7.11.2018

1 Hankkeen yleiskatsaus

Liikennevirasto ja Kreate Oy ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen 2.10.2018.

Urakan Kick Off tilaisuus järjestettiin Pasilassa, johon kokoontui noin 30 hankkeeseen osallistuvaa henkilöä.

Urakan kehitysvaiheen turvallisuuden aloituskokous pidetty 4.10.2018.

Puuston poiston kilpailutus on käynnissä.

Asukastilaisuus järjestetään 27.11.2018 klo 18.00 Klaukkalan Monikossa.

Pohjavesiputkien seuranta mittauksia on suoritettu jälleen syyskuussa. Seurantamittaukset jatkuvat kerran kuukaudessa vuoden 2018 loppuun saakka.

Hankkeessa ei ole sattunut tapaturmia.

2 Aikataulu

STk- urakan kehitysvaihe on käynnistynyt ja se päättyy alustavasti joulukuussa 2018. Toteutusvaihe käynnistyy kehitysvaiheen jälkeen, alustavasti joulukuussa 2018.

Rakennustyöt käynnistyvät maastossa alustavasti vuoden 2019 alussa.

Kirkkotien eritasoliittymän kohdan kaava ei ole lainvoimainen. Eritasoliittymän alueelle päästään töihin kaavan vahvistuttua vasta keväällä 2019.

Vuosien 2019-2021 aikataulu tarkentuu kehitysvaiheessa.

Urakka valmistuu syksyllä 2021.

3 Kustannukset

Koko hankkeen toteutuneet ja sidotut (solmitut sopimukset) kustannukset (alv 0 %) 31.10.2018 mennessä on esitetty seuraavassa taulukossa:


		Liikennevirasto	Nurmijärvi	YHTEENSÄ
Yhteiset	Sidotut kustannukset	1 003 246,96 €	313 524,61 €	1 316 771,57 €
	Toteutuneet kustannukset	377 604,15 €	118 005,87 €	495 610,02 €

Kustannukset eivät sisällä tilaajien omia kustannuksia.

Koko hankkeen määräraha on 42 M€ ja ennuste on 34 M€.

7.11.2018

Kuva 5. Hankkeen kustannukset 10/2018

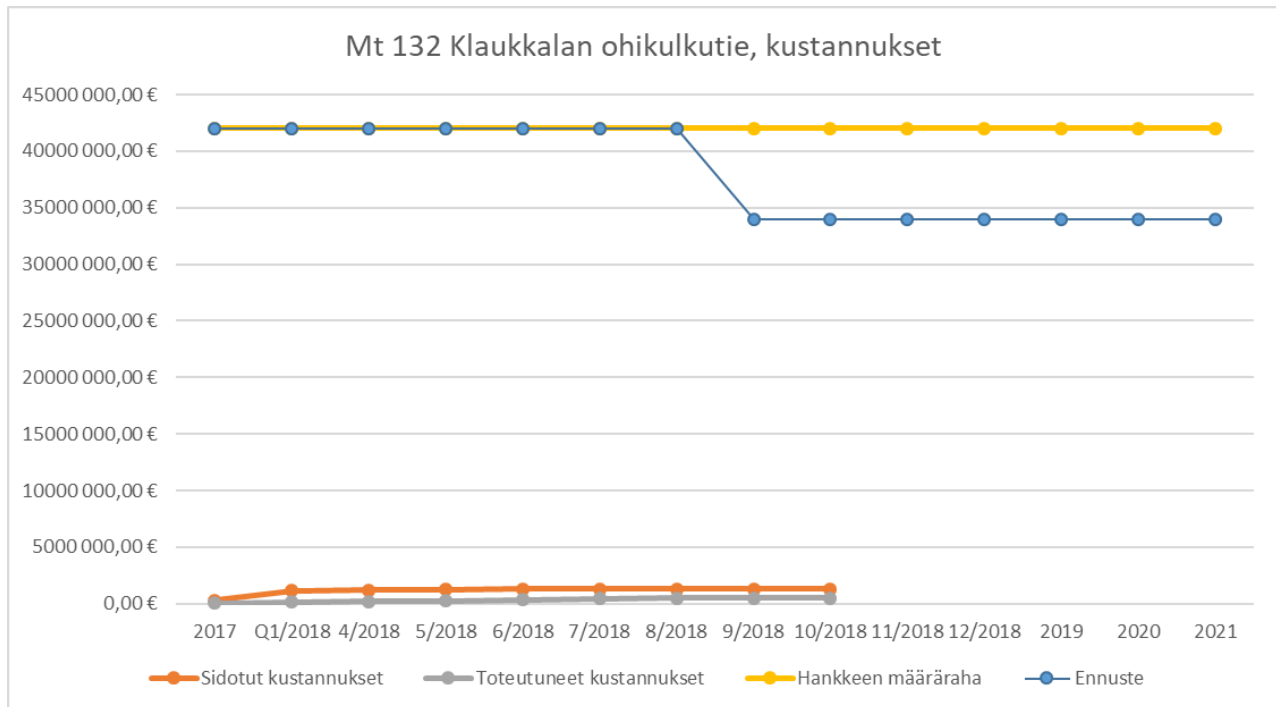

4 Muut asiat

Hankkeelle aukaistu lokakuussa omat Facebook-sivut, jossa julkaistaan tiedotteita hankkeen etenemisestä sekä tietoa STk-urakkamallista. Hankkeelle löytyä Facebook:sta nimellä "Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie".

Hankkeen viestintä:

- Internet: <https://www.liikennevirasto.fi/klaukkalanohikulkutie>
- Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=vBLAOsOniBI>
- Facebook: <https://www.facebook.com/klaukkalanohikulkutie>
